

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR							
Fecha de elaboración del informe	DD	MM	AAAA	Periodo de seguimiento	Del 03/10/2021 al 30/12/2021	Informe número	3
	30	12	2021				
Nombre del supervisor o Interventor	CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA				Correo electrónico		
Cargo	Vicerrectora de Investigación y Proyección Social				viceinvestigaciones@usco.edu.co		
Dependencia	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social						
Nombre del apoyo a la supervisión	Jhonatan Ruiz León				Correo electrónico		
Cargo	Apoyo a la supervisión				jhonatan.ruiz@usco.edu.co		

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
BPIN	Nombre del proyecto					Vigencia de los recursos				
2020000100011	Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá					2019-2020				
OCAD	OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación				Acuerdo aprobatorio	No.	Fecha	Valor aprobado	Votación aprobación del proyecto	
						97	04/09/2020	1.901.531.315,82	Si	No
Plazo Inicial (meses)		Descripción Alcance del Proyecto				Identificación de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad de Alzheimer.				
36 meses										

3. ALCANCE ENTREGABLES:

Indicador	Cantidad	Porcentaje de cumplimiento
Infraestructura para la investigación adecuada	1	0 %
Medido a través de: Número de infraestructura		
Infraestructura para la investigación dotada	2	0 %
Medido a través de: Número de infraestructura		
Artículos de investigación	1	0 %
Medido a través de: Número de artículos		
Documentos de investigación	1	0 %
Medido a través de: Número de libros y/o documentos		

Localización	Departamento	Huila - Caquetá		No. de beneficiarios	Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución		Fuentes de financiación SGR		Otras fuentes	
	Municipio	Neiva - Florencia			Si	No	Directas	Fondo (CTel)	Dinero	Especie
	Corregimiento	No aplica		240	X		N/A	X	X	X
	Vereda	No aplica								
	Otro	No aplica								
Avance de ejecución	% GESPROY		Sector		Área de influencia <small>Según la Ley 388 de 1997</small>		Alertas no subsanadas (GESPROY)			
Físico	26,61%		Ciencia, Tecnología e Innovación		Urbano	X	Retrasos en el cronograma actividades con semáforo en rojo			
Financiero	30,47 %				Rural		Falta información de los contratos y contratistas			
4. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO										
5.1 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)										
No aplica.										
FECHA	RUBRO	valor contrato	FECHA DE PAGO	CONTRATOS	IDENTIFICACION	NOMBRE	OBJETO			
2021-12-09 00:00:00	ACTI - HUILA	1.214.570,00	29/12/2021	VIPS 583 B2021	1075257280	SANDOVAL OLIVERA ADRIANA	SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIONAL EN EL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES SURCOLOMBIANO HUILA , CAQUETA BPIN 202000010001.			
2021-11-22 00:00:00	ACTI - HUILA	960.000,00	30/12/2021	FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 0007	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
2021-11-22 00:00:00	ACTI - HUILA	1.200.000,00	30/12/2021	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0008	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
2021-11-22 00:00:00	ACTI - HUILA	113.239,00	30/12/2021	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 009	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021			
2021-11-22 00:00:00	ACTI - PUTUMAYO	846.761,00	30/12/2021	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 009	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN NEIVA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021			
2021-11-22 00:00:00	ACTI - PUTUMAYO	1.340.000,00	30/12/2021	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0010	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021			



2021-10-20 00:00:00	ACTI - HUILA	960.000,00	29/10/2021	SOLICITUD No. 0005	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PY MARCADOR COGNITIVO PRECLINICO DETECCION TEMPRANA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES, A REALIZARSE EN FLORENCIA ENTRE EL 2 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021
2021-10-20 00:00:00	ACTI - HUILA	960.000,00	29/10/2021	MEMORANDO No. 0006	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$960.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000
2021-10-13 00:00:00	ACTI - HUILA	550.060,00	29/12/2021	ORDEN DE SERVICIO 010 2021	1075246858	VARGAS RUIZ NATALIA	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CON DESTINO AL PROYECTO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON CODIGO BPIN 2020000100011 PARA LA CIUDAD DE NEIVA.
2021-10-01 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	154.254.939,00	04/02/2022	CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	900358506	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.	COMPRA DE INSUMO CONSUMIBLES DE LABORATORIO Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO ESTUDIOS DE UN MARCADOR COGNITIVOS PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SURCOLOMBIANO HUILA. CAQUETA, CON CODIGO BPIN 202000100011.
2021-10-01 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	154.254.939,00	14/12/2021	CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	900358506	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.	COMPRA DE INSUMO CONSUMIBLES DE LABORATORIO Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO ESTUDIOS DE UN MARCADOR COGNITIVOS PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SURCOLOMBIANO HUILA. CAQUETA, CON CODIGO BPIN 202000100011.
2021-09-22 00:00:00	ACTI - HUILA	1.920.000,00	29/12/2021	MEMORANDO No. 0061	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS	SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE RP PARA AVANCE DE GASTOS DE VIAJES (TRANSPORTES) POR UN TOTAL DE \$1.920.000, CON CARGO AL CDP No. 4221 FUENTE DE FINANCIACIÓN HUILA, AVANCE DE TRANSPORTE PARA NEIVA \$960.000, AVANCE DE TRANSPORTE PARA FLORENCIA \$960.000
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	3.577.460,00	29/12/2021	VIPS 456 B 2021-51	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	3.577.460,00	22/12/2021	VIPS 456 B 2021-52	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011



2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	3.577.460,00			1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
			24/11/2021	VIPS 456 B 2021-53			
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	3.577.460,00			1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
			24/11/2021	VIPS 456 B 2021-53			
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	4.968.696,00			1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
			29/12/2021	485 VIPS ±B2021,OF-53			
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	4.968.696,00			1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
			22/12/2021	485 VIPS ±B2021,OF-53			
							PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	4.968.696,00			1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN AREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO TITULADO ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETA. CÓDIGO BPIN 2020000100011
				485 VIPS ±B2021,OF-53			
	TOTAL	347.790.436,00					

6. LOCALIZACION

Las actividades se vienen desarrollando en dos municipios (Neiva y Florencia), la sede principal del proyecto está en la ciudad de Neiva, en la carrera 10 # 3 -64 barrio altoico, en donde se encuentra el laboratorio de neuropsicología de la Universidad Surcolombiana, a continuación se relaciona material audiovisual del sitio donde se desarrollan las actividades



2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas



Iglesia nuestra señora madre de la iglesia Juan XXIII, Florencia Caquetá



Institución Jorge Eliecer Gaitan, Florencia Caquetá

2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas

Programa Adulto Mayor, Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión Alcaldía de Neiva, Huila



Fundación FUNIPSI Neiva, Huila





A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en el marco de la supervisión:

- .
- Se analizaron los factores de ejecución del proyecto con el fin de diagnosticar oportunamente los posibles riesgos que puedan afectar la eficacia del proyecto y así tomar medidas necesarias para mitigarlos.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos establecidos en el proyecto.
- Se atendieron las diferentes solicitudes del coordinador en ejecución del presente proyecto.
- Se realizó revisión de las solicitudes realizadas por la coordinación del proyecto con el fin de salvaguardar la correcta ejecución de las actividades.
- Se constató el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.
- Se revisó los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Se constató los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.
- Fueron revisadas las alertas presentadas en el GESPROY y se acompañó a la coordinación del proyecto para la subsanación de las mismas.
- Se realizó revisión y seguimiento a las cuentas de cobro.

7.1 PRESUPUESTO DETALLADO

A continuación se presenta el presupuesto aprobado.

CÓDIGO DEL PROYECTO:		MONTO APROBADO (\$):				
BPIN2011000100180						
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 738.489.005	\$ 69.115.616	\$ 3.312.464	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 913.918.150
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 216.074.066	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 216.909.468
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 130.490.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.490.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 149.060.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.060.880
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 89.436.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.436.528
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,0	\$ 17.879.032,0	\$ 100.524.003,0	\$ 14.041.028,0	\$ 2.306.074.577,82

En el siguiente cuadro se encuentra los consolidados financieros por los rubros en la MGA y se establecen los saldos a la fecha:



A continuación se presenta las actividades aprobadas por el OCAD de CTel y se especifica el estado de cada uno frente a los ajustes que puedan representar y que están tipificados en la norma:

CÓDIGO DEL PROYECTO:												
código EPIN 202000100011		ACUMULADO					BALDO					
RUBRO	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO			ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 197.334.150,30	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 200.706.614,30	\$ 541.094.854	\$ 69.115.616	\$ -	\$ 99.686.601	\$ 3.312.464	\$ 715.211.535
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.393.079	\$ 292.365.585	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 77.677.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.677.529,00	\$ 158.396.537	\$ -	\$ -	\$ 85.402	\$ -	\$ 158.231.839
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.654.626	\$ -	\$ 14.566.569	\$ -	\$ 5.489.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 10.652.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.652.000,00	\$ 119.838.379	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.838.379
8. INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 39.473.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.473.529,33	\$ 109.597.351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.597.351
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 24.015.364,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.015.364,40	\$ 65.421.164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.421.164
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 349.212.575,6	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 352.525.037,63	\$ 1.552.516.742,19	\$ 272.099.199,00	\$ 14.566.569,00	\$ 109.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 1.933.549.540,19

Ítem	Nombre de la actividad MGA	Vr. Inicial	Vr. Ajustado	Vr. Final
1.1.1	Adecuar infraestructura para laboratorio	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00	\$62.401.482,00
1.1.2	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
1.1.3	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
1.2.1	Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$627.376.662,00	\$ 675.646.790,90	\$675.646.790,90
2.1.1	Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00	\$9.042.368,00
2.1.2	Seleccionar los sujetos del estudio	\$139.694.394,82	\$139.694.394,92	\$139.694.394,92
2.1.3	Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$1.091.317.270,00	\$1.043.047.141,00	\$1.043.047.141,00
2.1.4	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
2.1.5	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
3.1.1	Divulgar y socializar resultados del estudio	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00	\$107.254.338,00
3.1.2	Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00	\$30.490.655,00
3.1.3	Administración del proyecto	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00	\$49.686.960,00
3.1.4	Apoyo a la supervisión	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00	\$29.812.176,00
		\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82	\$2.306.074.577,82



Hasta la fecha se ha cumplido lo establecido en el cronograma del proyecto, desde la coordinación del proyecto se manifiesta que se están realizando las actividades de planeación para ajustar el cronograma en el mes de agosto-septiembre, octubre y noviembre, para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto., se realizó lo programado en lo que tiene que ver con el personal y sus actividades y evaluaciones a los participantes en el proyecto; sin embargo está pendiente la compra de la compra de quipos y software, los equipos están con precios muy elevados en el mercado por el incremento del dólar y no hay existencias de las referencias que se necesitan, toca programado, se requiere realizar una redistribución de rubros en actividades para poder comprar los equipos que se necesitan en el proyecto y poder realizar las actividades de socializaciones internacionales.

TIEMPO ACTIVIDAD MGA	AÑO 1												AÑO 2												AÑO 3																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
Realizar las adecuación de infraestructuras para laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Adquirir los equipos y software para los laboratorios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Socializar del proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	X	X	X	X																																						
Seleccionar los sujetos de estudio			X	X	X	X																																				
Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio				X	X	X	X	X								X	X	X	X	X									X	X	X	X	X									
Procesar, analizar los datos recolectados y escribir documento de investigación					X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X							
Divulgar y socializar resultados del estudio																						X	X												X	X	X					

2021-10-01 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	77.127.470,00	900358506	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.
2021-10-01 00:00:00	ACTI - CAQUETÁ	CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	77.127.469,00	900358506	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.
2021-09-22 00:00:00	ACTI - HUILA	MEMORANDO No. 0061	1.920.000,00	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ ALFREDIS
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	VIPS 456 B 2021-51	993.739,00	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	VIPS 456 B 2021-52	993.739,00	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	VIPS 456 B 2021-53	993.739,00	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	VIPS 456 B 2021-53	596.243,00	1075221059	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	485 VIPS ±B2021,OF-53	1.656.232,00	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	485 VIPS ±B2021,OF-53	1.656.232,00	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA
2021-09-10 00:00:00	ACTI - HUILA	485 VIPS ±B2021,OF-53	1.656.232,00	1075299807	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA



11. MODIFICACIONES, AJUSTES, PRORROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)

No aplica

12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda analizar la posibilidad de realizar una redistribución de actividades y rubros sin afectar alcance y, metas y objetivos para lograr la compra de equipos y software.
- Se realizó la reprogramación del proyecto según circular 14 de DNP que fija como plazo máximo el 30 de septiembre del presente año.
- Se requiere mejorar los procesos administrativos, de compras para lograr realizar con afectividad requeridas en el proyecto y lograr ingresar al personal en el proyecto a tiempo para lograr la planeación del proyecto, ya que continúa desde la coordinación del proyecto se manifiesta retrasos en los trámites de los procesos.
- Es importante para el proyecto que se logre ingresar a tiempo el personal en el mes de enero del año 2022.

13. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)

Hasta la fecha no se han realizado pruebas de laboratorio que requieran certificados de calidad.

14. ANALISIS APLICACION DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACION Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)

Se realizó según el objeto: COMPRA DE INSUMO CONSUMIBLES DE LABORATORIO Y OTROS INSUMOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO ESTUDIOS DE UN MARCADOR COGNITIVOS PRECLINICO PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DE SURCOLOMBIANO HUILA, CAQUETA, CON CODIGO BPIN 202000100011. Proveedor DE LA ROSA RESEARCH S.A.S. Se cumple el procedimiento, pero el proceso para el pago es muy demorado y afecta el nombre y el servicio con el proveedor.

15. CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)

No aplica

16. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES


- El proyecto se viene ejecutando de acuerdo a lo dispuesto en el cronograma y documento técnico aprobado.
- Dentro de los procesos de planeación se recomienda a la coordinación Analizar la viabilidad de la redistribución y/o reprogramación de actividades para el año 2022, para en caso tal de requerir postergar realizar la debida reprogramación en GESPROY.
- Desde la vicerrectoría se espera implementar el procedimiento de calidad para el Sistema General de Regalías con el fin de agilizar los procesos de ejecución de los proyectos.
- Se requiere el informe trimestral de la Uniamazonia sobre la ejecución de los rubros y actividades programadas.


17. ANEXOS

A continuación se anexan los siguientes documentos anexos al informe:

- ✓ Informe Financiero entregado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Informe Técnico trimestral presentado por la coordinación del proyecto.
- ✓ Soportes de ejecución

18. FIRMA


LINA MARIA FIERRO GONZALEZ
Directora Administrativa de Proyección social y Proyectos Especiales


JHONATAN RUIZ LEÓN
Cédula: 1.110.540.432



Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano Huila, Caquetá.
BPIN 2020001000011

ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ BPIN2020000100011 Nª CDP-SPGR 2721

Objetivo Validar un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y Caquetá

Entidad ejecutora Universidad Surcolombiana
Grupo de investigación MI Dneuropsy – Categoría A1
Investigador principal y alianza internacional
Entidad aliada: Universidad de la Amazonia
Grupo de Investigación Ingeniería de Software
Grupo de Investigación YONEMA

INFORME TECNICO Y FINANCIERO

Universidad Surcolombiana

28 de Enero de 2022

Tabla de contenido

Información general.....	4
Presentación y objeto del proyecto.....	5
EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA.....	6
METAS GENERALES DEL PROYECTO	12
INFORME TECNICO	13
1. - OBJETIVO ESPECÍFICO	13
1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas	13
1.1 Infraestructura para la investigación adecuada.....	13
1.1.1 Adecuar infraestructura para laboratorio	13
Infraestructura-Efectivo-UA:.....	14
1.1.2 Administración del proyecto.....	14
1.1.3 Apoyo a la supervisión	15
1.2 Infraestructura para la investigación dotada	16
1.2.1 Adquirir equipos de software para el laboratorio	16
1.2.3 Adquirir equipos de software-Aporte del SGR	17
OBJETIVO ESPECÍFICO 2	19
2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio	19
2.1 Artículos de investigación.....	19
2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.	19
2.1.2 Seleccionar los sujetos de estudio	22
2.1.2.1 Introducción al protocolo y formación en evaluación neuropsicológica, psicofisiológica y neurofisiológica.....	23
2.1.1.2 Reuniones equipo de profesionales	23
2.1.2.3 Creación de manual y protocolo de valoración neuropsicológico, psicofisiológico y neurofisiológico	23
2.1.2.4 Proceso de inducción y capacitación al protocolo.....	24

2.1.2.5 Conformación comité técnico científico.....	24
2.1.2.6 Aportar en la ejecución del algoritmo de decisión clínica para la selección de sujetos de estudio y asignación de casos y controles	25
2.1.2.6 Aportar en la ejecución del algoritmo de decisión clínica para la selección de sujetos de estudio y asignación de casos.....	25
2.1.2.7 Apoyar en la elaboración de informes de los resultados de las evaluaciones.....	26
2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio	28
INFORME FINANCIERO	33
- OBJETIVO ESPECÍFICO	33
1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas.....	33
2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio	37
2.1.2 Seleccionar los sujetos del estudio	38
2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.....	42
2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. (Contratación 2022 de la Actividad)	45
CONTRATOS Y CONRATISTAS SUSCRITOS	45
RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	47
CDP EXPEDIDOS Y SALDOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.....	51
SALDOS POR FUENTES A ENERO 2022	52
SALDOS Y ACUMULADOS A CORTE 31-12-2021	52
INFORME FINANCIERO A CORTE 31 -12-2021	53
MONTOS APROBADOS	53
SALDOS Y ACUMULADOS A CORTE 30-01.2022	54
INFORME FINANCIERO A CORTE 30 -01-2022	54
INFORME DE GESPROY.....	56
ALERTAS DE GESPROY.....	57

INFORMACIÓN GENERAL

	Tipo de informe: INFORME TECNICO Y FINANCIERO A CORTE 31 DE ENERO 2022	Informe No. 3
Título	ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ BPIN2020000100011 Nª CDP-SPGR.	
Programa Nacional o área al cual se encuentra adscrito el proyecto	Minciencias	
Entidad ejecutora	Universidad Surcolombiana	
Entidad operadora	Universidad Surcolombiana	
Entidad aliada	Universidad de la Amazonia	
Fecha de Inicio de ejecucion	03 de Marzo de 2021	
Fecha Final	03 de Marzo del 2024	
Fecha de entrega del informe	01 Febrero del 2022	
Ciudad/País	Neiva, Colombia	

Presentación y objeto del proyecto

El objetivo de este estudio es la validación de un marcador cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer en adultos mayores del Huila y Caquetá. Para su desarrollo, se ha diseñado un estudio longitudinal analítico observacional de casos y controles.

Se prevé una muestra de 240 pacientes (160 con DCL y 80 controles) que serán valorados tres veces, con un intervalo de 12 meses (± 2 mes), mediante un protocolo de investigación constituido por pruebas cognitivas útiles para la detección temprana de la EA y tres evaluaciones psicofisiológicas de la integración de la MCP y patrones de movimiento ocular, con un intervalo de 12 meses (± 2 mes). Esta metodología permitirá comparar sensibilidad, especificidad y valor predictivo a través de estos métodos de evaluación. Para la ejecución de este proyecto se cuenta con un equipo interdisciplinario con formación postgradual en áreas de la salud y ciencias humanas; con experiencia investigativa, los investigadores han desarrollado estudios publicados en revistas indexadas relacionados con los temas a abordar.

Existe una necesidad frente a la adecuación dotación de laboratorios programada en el proyecto y la gestión futura de laboratorios, dotaciones, equipos y software estará a cargo de cada institución a través de sus respectivos programas académicos y grupos de investigación. Los resultados del proyecto podrán informar si esta tarea podría lograr un fidedigno poder predictivo de la EA para ser considerada un marcador cognitivo preclínico en adultos mayores del sur de Colombia; lo cual estará evidenciado en un artículo de investigación y un documento de investigación. Adicionalmente se fortalecerá las capacidades de investigación con un laboratorio adecuado.

A partir de esta realidad se elabora y presenta el proyecto ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ
BPIN2020000100011 N^a CDP-SPGR 2721

EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA

2021

No. Consecutivo	Tipo de Solicitud	Fecha
0001	Solicitud Cdps VIPS - Dr. Alexander Quintero	17/03/2021
0002	Solicitud Vinculación VIPS - Dr. Alexander Quintero	24/03/2021
0003	Solicitud Cdps Natalia E Y Eduardo VIPS - Dr. DOLLY ARIAS TORRES	09/06/2021
0004	Solicitud Procedimiento CTIC VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	11/06/2021
0005	Solicitud De Vinculación Personal VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	21/06/2021
0006	Solicitud De Vinculación Personal VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	21/06/2021
0007	Solicitud De Vinculación Personal (Mario) VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	21/06/2021
0008	SOLICITUD RP CONVENIO UNIAMAZONIA VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	28/06/2021
0009	Solicitud Aval Evaluación Programa Adulto Mayo Alcaldía De Neiva Secre. Desarrollo Social-Alcaldía De Neiva	07/07/2021
0010	Solicitud Aval Evaluación Iglesia Asamblea De Dios, Neiva Pastor Briton Moreno	07/07/2021
0011	RADICACION DE CUENTAS VIPS -DOLLY ARIAS	07/07/2021
0012	Solicitud Modificación Contrato Natalia VIPS -DOLLY ARIAS	07/07/2021
0013	Solicitud Aval Evaluación Iglesia Pentecostal Pastor Julián González	12/07/2021
0014	Solicitud Aval Fundación Mis Años Dorados Directora Ángela María Mendoza	12/07/2021
0015	Solicitud Aval Asamblea De Dios- Siglo 21Pastora Aleida Moreno	12/07/2021
0016	Solicitud Aval Grupo Adultos Mayores- Barrio Caracolí Coordinadora, Gladis Villareal	12/07/2021
0017	Solicitud De CDP TALENTO HUMANO VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	09/07/2021
0018	Solicitud De CDP GASTOS DE VIAJE VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	13/07/2021
0019	Solicitud De VINCULACION MARIO PARRA VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	13/07/2021
0020	Solicitud Revisión Y Aprobación Resignificaciones Metodológicas VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	13/07/2021
0021	Solicitud Revisión Y Aprobación Resignificaciones Financieras VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	13/07/2021
0022	RADICACION DE CUENTAS JULIO VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	19/07/2021

0023	RADICACION DE CUENTAS EDUARDO Y LAURA VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	19/07/2021
0024	Solicitud De INGRESO MARI PARRA Solicitud De INGRESO MARI PARRA	19/07/2021
0025	Solicitud De INGRESO De RUDY DANIELA RODRIGUEZ Y RUDY MARCELA SANCHEZ Solicitud De INGRESO MARI PARRA	23/07/2021
0026	Modificaciones Al Proyecto BPIN 011 VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	28/07/2021
0027	Vinculación Del Dr. Mario Parra VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	29/07/2021
0028	Solicitud De RP- De RUDYS VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	29/07/2021
0029	Solicitud De RP- De Mario VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	29/07/2021
0029	Solicitud Corrección O Cancelación De RP DE MARIO, RUDY DANIEL Y RUDY MARCELA	29/07/2021
0030	Solicitud De CDP Para Compra De Computadores e Impresora Y Software VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	04/08/2021
0031	Solicitud De CDP De Cdp Materiales E Insumos VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	04/08/2021
0032	Solicitud Hogar Geriátrico La Alegría De Los Abuelos Raquel Castillo Erazo	05/08/2021
0033	Solicitud Aval Evaluación Iglesia Jesucristo Es La Única Esperanza Pastor Henry Cuellar	02/08/2021
0034	Solicitud De CDP De Equipos Y Accesorios VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	05/08/2021
0035	Solicitud Aval Evaluación Iglesia Alianza Cristiana Y Misionera David Figueroa	06/08/2021
0036	Solicitud Aval Evaluación Iglesia Cristiana Avivamiento Pastor	09/08/2021
0037	Solicitud Virtual De Pago A Contratistas VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	10/08/2021
0038	Solicitud Espacio Socialización Grupo Familiares Neiva Gloria Maritza Tovar	10/08/2021
0039	Solicitud Iglesia Pentecostal Sede Pedregal Eimar Riaños	10/08/2021
0040	Solicitud Fundación Emprendedores Del Futuro Colombia Jina Castillo	10/08/2021
0041	Solicitud Oficina Asesora De Comunicaciones José Eliseo Bacue	12/08/2021
0042	Solicitud De Creación De Proveedor De Avance De Transportes VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	16/08/2021
0043	Solicitud De RP De Insumos Consumibles De Laboratorio Y Otros Insumos De Laboratorio. VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	16/08/2021
0044	SOLICITUD DE RP TALENTO HUMANO Duvan Y Laura VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	16/08/2021
0045	Solicitud De Evaluación Del Servicio De Fotocopias En Neiva VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	16/08/2021
0046	Solicitud De RP De Para Contratar Adquisición De Equipos De Cómputos VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	16/08/2021

0047	SOLICITUD DE VINCULACION DE DUVAN Y LAURA DANIELA VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	16/08/2021
0048	Solicitud De RP De Convenio De La Amazonia VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	18/08/2021
0049	OFICIO PAGOS MES DE AGOSTO VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	31/08/2021
0050	Solicitud Remisión Usuarios Hospital Guillermo González Manrique	01/09/2021
0051	Solicitud de ingreso de GISELA CALA Y TATIANA VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	03/09/2021
0052	Solicitud de RP DE GISELA Y TATIANA VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	03/09/2021
0053	Solicitud contratación de servicio de fotocopias en Florencia VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	06/09/2021
0054	Solicitud socialización Florencia Iglesia nuestra señora madre Parroco Alipio Guzmán	09/09/2021
0055	Solicitud socialización Florencia grupo de oración lazos de amor Oscar Rivas	09/09/2021
0056	Solicitud socialización Florencia Alianza Cristiana y Misionera Juan Pablo Rodríguez	09/09/2021
0057	Solicitud socialización Florencia Fundación Horizonte Dora Luz Ortiz Morales	09/09/2021
0058	Solicitud socialización Florencia Secretaria de Inclusión Hernán Bernal Artunduaga	09/09/2021
0059	Solicitud Socialización Florencia Colegio Juan Bautista de la Salle José Yesid López García	09/09/2021
0060	Solicitud de RP de avance mes de septiembre de transportes Neiva y Florencia VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	10/09/2021
0061	Solicitud socialización Florencia subsecretaria de despacho cobertura educativa Dra. Patricia Ortiz	13/03/2021
0062	Solicitud socialización Florencia Presidente junta de acción comunal Barrio Jorge Eliécer Gaitán Hernán Guzmán Vallén	13/03/2021
0063	Oficio informativo sobre el proyecto al secretario de inclusión departamental	13/03/2021
0064	Solicitud de avance mes de septiembre de transportes Neiva y Florencia VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	13/03/2021
0065	Solicitud de evaluación de cotizaciones de compra de materiales y papelería VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	13/03/2021
0066	CONCETO TECNICO PARA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	16/09/2021
0067	Solicitud socialización Florencia coordinador Jorge Eliecer Gaitán Coordinador colegio Jorge Eliecer Gaitán	20/09/2021
0068	Socialización Florencia Sede Bosco Coordinadora Consuelo Sánchez	20/09/2021
0069	OFICIO PAGOS MES DE SEPTIEMBRE VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	20/09/2021

0070	Oficio remitarios estudio previos compra de insumos Lab. HEYDY FERNANDA SALA/AJ CONTRATACION	21/09/2021
0071	Solicitud socialización Neiva Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Pastor Artermo Jiménez	28/09/2021
0072	Solicitud fundación mejor vivir Directora Rufina Vargas	28/09/2021
0073	Solicitud socialización Neiva Funipsi Leisa Maria Borja Garcia	01/10/2021
0074	Solicitud ingreso al proyecto Dr. William sierra baron VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	04/09/2021
0075	Solicitud de RP de octubre de transportes Neiva y Florencia VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	04/09/2021
0076	Solicitud de avance de avance mes de septiembre de transportes Neiva y Florencia VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	04/09/2021
0077	Solicitud socialización La Esperanza, Vida alternativa Representante Legal Martha Borrero	06/10/2021
0078	Solicitud de RP SPGR servicios de fotocopias CONTRATACION	06/10/2021
0079	OFICIO PAGO MES DE OCTUBRE VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	20/10/2021
0080	oficio desembolso recursos del convenio U amazonia a la USCOUNIMAZONIA	29-10_2021
0081	Oficio solicitud ejecución presupuestal 2022 VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	02/11/2021
0082	Oficio solicitud USAP Directora USAP Zulma	04/11/2021
0083	Oficio solicitud Florencia socialización Presidente JAC B. Nueva Colombia María Moreno	08/11/2021
0084	Oficio solicitud Florencia socialización Hogar Los Piolines Magalys Yolanda Vergara Jiménez	08/11/2021
0085	Oficio solicitud Florencia socialización institución educativa Antonio Ricaurte Joel Quesada,	08/11/2021
0086	Oficio radicación avance de mes de octubre tesorería	10/11/2021
0087	Oficio de radicación paga anticipado La rosa VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	10/11/2021
0088	Oficio solicitud de RP avance del mes de Noviembre} VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	10/11/2021
0089	Oficio solicitud de RP avance del mes de diciembre VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	15/11/2021
0090	Oficio solicitud de avance de Noviembre VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	15/11/2021
0091	Oficio solicitud de avance de Diciembre VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	15/11/2021
0092	Oficio para solicitud contrapartida la amazonia UNIMAZONIA	10/11/2021
0093	OFICIO PAGO MES DE NOVIEMBRE VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	20/10/2021
0094	OFICIO PAGO MES DE NOVIEMBRE VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	20/10/2021
0095	OFICIO OTRO SI COMPRA DE INSUMOS LA ROSA VIPS- Dra. Dolly Arias Torres	20/10/2021
0096	OFICIO INGRESO PERSONAL ADRIANA ZANDOVAL VIPS-	01/12/2021
0097	OFICIO SOLICITUD DE RP INGRESO ADRIANA ZANDOVAL VIPS	01/12/2021

0098	OFICIO ORDEN DE APGO FOTOCOPIAS 010 CONTRATACION	10/12/2021
0099	OFICIO SOLICITUD CAMBIO DE DESCARGA HORARIA VIPS- Carlos Harvey Salamanca Falla	13/12/2021

2022

No. Consecutivo	Tipo de Solicitud	Fecha
0103	Solicitud de Talento Humano	
0104	Solicitud de Vinculación de talento Humano	
0105	Solicitud de talento humano - Dr Mario Parra, se realiza por Resolución, y define que se tramite para en el mes de febrero del 2022.	
0106	Solicitud de RP de Dr Mario parra - Se realiza por Resolución, y definen que se tramite para en el mes de febrero del 2022.	
0108	Solicitud de Vinculación a la ARL de talento humano	
0109	Cdp Talento humano	
0110	Cdp Talento humano	
0110	Solicitud de cdp de Jasmin Bonilla santos	
0111	Solicitud afiliación arl talento humano_Jasmin Bonilla	
0112	Solicitud generación rp talento humano_jasmin Bonilla	
0113	Solicitud vinculación jasmin Bonilla	
0114	Solicitud de anulación de cdp - de plataforma - SGGR	
0115	Solicitud de vinculación arl Rudy Marcela Sánchez	
0116	Solicitud de gastos de viaje	
0117	Solicitud de apropiación aportes de la USCO en efectivo	
0118	Solicitud de apropiación de aportes de la amazonia en efectivo trasladados al USCO	
0119	Solicitud rp transferencia convenio UNIAMAZONIA	
0120	Solicitud de vinculación y de Rp de Mónica	
0121	Solicitud de Vinculación de Arl de Mónica	

- Se realizo el proceso de seguimiento y gestión para la firma del Otrosi No. 2 del convenio con la Amazonia para su firma.

- Solicitud y recepción de los documentos de la Uniamazonia para el giro del recurso a la Uniamazonia.
- Se realizo el informe Financiero del proyecto.
- Se cargo la información Financiera a la plataforma de Gesproy
- Se realizo actualización de información en el Gesproy de los contratos del 2021.
- Se solicitarón los documentos a los contratistas y se verifican los soportes para la contratación del 2022.
- Se realizan los estudios previos a los para la vincualción de los contratistas
- Se actualizarón las cotizaciones para la compra de los Equipos de computo y papeleria
- Pendiente la expedición de los Cdp.
- Se realizo reunion con la vicerectoria de investigación con el objetivo de evaluar el cargue de la información en el gesproy y actualización de la información.
- Se realizo reunión de asesoría con la supervisión para explicar la forma de actualizar información faltante en gesproy y las alertas pesnidentes por solucionar, adicional colocar metas de informes mensuales de a la supervisión en la ejecución.
- Cuentas de cobro de los los Contratistas mensulamente
- Informes financieros mensual
- Informe a la supervisión
- Cuentas de cobro gestión y pago
- Reuniones administrativas

METAS GENERALES DEL PROYECTO

No.	Indicadores para medir los objetivos del proyecto	Meta total	Meta año 0	Meta año 1	Meta año 2
1	Numero de infraestructura adecuada	1	1	0	0
2	Numero de infraestructura dotada	2	2	0	0
3	Artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales	1	0	0	1
4	Libros y/o capítulos de libros resultados de investigación	1	0	0	1

Respecto a los Indicadores de el proyecto tenemos como resultado la infraestructura para la investigación adecuada, medido a través de numero de infraestructura tenemos un 5% de avance, teniendo en cuenta que se ha realizado un esfuerzo, en el convenio suscrito entre la Uniamazonia y la Usco, dio inicio a la la ejecución de las adecuaciones de las instalaciones de la Uniamazonia, Es importante anotar que la fecha de terminación del contrato es el 11 de febrero de 2022 y está dentro de los términos del mismo.

Infraestructura para la investigación dotada, medido a través de la infraestructura dotada # 2, con un avance de 35%, este indicador viene cumpliéndose en un porcentaje aceptable, teniendo en cuenta que esta pendiente las certificaciones de los aportes de la Usco en especies ya ejecutados, con las funciones y tiempo realizados por los docentes Alfredis Gonzalez coordinador del proyecto y Luisa Fernanda Muñoz Bernal por la USCO.

En la Uniamazonia, por la compra de equipos en particular la del equipo de Biosemi de la Amazonia, se giro 238 millones para esta compra, como adición de recursos **-otro si numero 2** de convenio de cooperación suscrito con la uniamazonia, un valor de transferencia del proyecto BPIN 2020000100011 \$63.018.399, y con estos valor a girar la uniamazonia firmaria el contrato de compraventa con LA ROSA RESERACH, con el objeto de comprar un equipo BIOSEMI.

En compra de los equipos para la Amazonia, se realizo el contrato de la adquisición DE LICENCIA E. PRIME V.3 PERPETUA ACADÉMICO NUEVA y el contrato de ADQUISICIÓN DE GAFAS CON RASTREO OCULAR Y DESCANSA BARBILLA.

En la compra de equipos de computo, impresoras para la USCO no se ha logrado comprar por alto costo en el mercado y poca existencia de los mismos, se considera realizar un solicitud al comité tecnico científico y gestión un mayor valor para la compra de estos equipos, en este proceso se se solicitarón los CDP para realizar en el mes de enero la compra en el mes de febrero del 2022 con el nuevo estatuto de contratación de la USCO , sin embargo se dejo para solicitarse en el mes de febrero, debido a que estan en tramite de sacar procesos que alcancen a tramitar antes de ley de garantias.

Los Articulos de investigación y el Documento de investigación Medidos a través de Numero de articulos y el numero de libros y /o capitulos, este indicador esta planificado para su inicio en el mes 18. Se considera de cada uno con un avance tecnico del 20%, debido a que se ha conseguido información, bibliografía de los diferentes resultados de las evaluaciones realizadas a los participantes en las diferentes actividades aplicadas a los mismos, lo que permite tener insumos importantes para la construcción a futuro de estas metas.

INFORME TECNICO

1. - OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas

1.1 Infraestructura para la investigación adecuada

1.1.1 Adecuar infraestructura para laboratorio

El 27 de mayo del 2021 se aprobó el convenio y el Modelo de Gobernanza entre La USCO y la UNIAMAZONIA. **

https://drive.google.com/drive/folders/1EF0a_IbZsJViyIckWGa5JZ1vy27dtQWT

https://drive.google.com/drive/folders/1EF0a_IbZsJViyIckWGa5JZ1vy27dtQWT

El 28 de junio de 2021 se firmó el otrosí, del convenio respecto al perfeccionamiento, legalización y ejecución; en donde se debe primero aprobar las pólizas de garantías y luego se dará el acta de inicio.

Mediante memorando No. 008 del 28 de junio de 202 se realizó solicitud de (RP 3821) y el 09 de julio se (adjunto) certificación de cuenta bancaria de la Universidad de la Amazonía, junto a la cuenta de cobro y se dio trámite de creación del tercero y registro de la Cuenta Bancaria en el SPGR.

Se constituyó las pólizas de cumplimiento 3001857 con fecha 9 de agosto del 2021.

Se realiza acta de inicio con fecha 27 de agosto del 2021 y se realiza el giro del recurso el 28 de octubre del 2021 con orden de pago 95577021.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/acta+de+inicio+convenio+uniamazonia/FMfcgzGkbDbSHdZbWJXRntFQtswPTTtDj?projector=1&messagePartId=0.1>

Se realiza el contrato de obra de adecuación del laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de la Uniamazonia con la empresa Constructora Arquímedes Zomac, por un valor de \$57.024.493 según contrato de obra 152 desde el 11 de noviembre hasta el 11 de febrero del 2022. CDP 210005601 del 12 de octubre del 2021.

El 26 de enero del 2022 continua en cumplimiento del cronograma del contrato SE ANEXA REGISTRO ACTUALIZADO.



Registro Fotográfico del 26 de enero del 2022
Construcción Laboratorio Uniamazonia

Infraestructura-Efectivo-UA:

Este recurso es un aporte en efectivos de la Universidad de la Uniamazonia; CDP Numero 210001453 expedido el 03/03/2021 de la Uniamazonia, este rubro está en proceso de contratación por La universidad de la Uniamazonia. Suma que se encuentra respaldada.

1.1.2 Administración del proyecto

Se inició la contratación a partir del 25 de abril del 2021 con la contratación de la Jurídica de proyecto y del Asesor contable y financiero del proyecto:

Entre las actividades realizadas ejecutadas están:

- Asesor administrativo y contable:
- Se asistió a los coordinadores en las labores administrativas y operativas que garanticen el cumplimiento de los tiempos de entregables e informes
- Se realizo el Seguimiento a la ejecución de cuentas, contabilidad, gastos mes a mes y otros aspectos establecidos por Gesproy y planeación departamental del proyecto.
- Se elaboracion y presentación de informes requeridos a las entidades pertinentes.
- Se realizaron las Consultoría y asesoramiento en el Área de Talento Humano
- Se elaboro y presentaron los estados financieros con sus correspondientes notas y con la periodicidad requerida en el proyecto.
- Otras que se presentaron de conformidad con las necesidades del contrato

Jurídico:

- Se Brindo asesoría y acompañamiento jurídico al proyecto en mención
- Se Proyectaron e peticiones jurídicas que sean requeridas
- Se contestaron las e solicitudes que se presentaron en relación con el proyecto –
- Se Brindo los conceptos jurídicos requeridos

Algunas de las actividades importantes en esta Actividad de administración del proyecto fueron:

- Realizar estudios previos para la contratación del personal y las compras de insumos y equipos 24 contratos.
 - Realizar solicitudes de compra o tipo procedimental a las diferentes instancias de la universidad 104 solicitudes realizadas
 - Revisar jurídica y financieramente la ejecución del proyecto y las compras, 6 procesos.
 - Solicitud de CDP Y RP y el control de la disponibilidad presupuestal de los rubros
 - Realizar y llevar la gestión documental del proyecto, física y en la Nube.
 - Realizar el proceso de para los pagos de los contratistas y los contratos con proveedores. (Mensual)
 - Realizar y revisar las cotizaciones requeridas para las compras de insumos. (12 cotizaciones)
 - Gestionar revisar seguridad social y documentación de contratistas. (Mensual)
 - Realizar el proceso de contratación del personal 19 contratos y resoluciones de lo corrido de año.
 - Requerimientos del personal contratado y otras instancias.
 - Realizar el reporte al Gesproy en forma mensual.
 - Enviar informe Financiero y técnico del proyecto
- Otras actividades

El 21 de enero de 2022 se contrató el jurídico y el asesor Administrativo bajo los siguientes criterios:

CONTRATISTAS	CARGO	VALOR MENSUAL	INICIO	FIN	VALOR TOTAL
JUAN CARLOS MADRID C	ASESOR ADMINISTRATIVO	\$ 2.484.348	21/01/2022	30/07/2022	\$ 15.734.204
TATIANA CUBILLOS	JURIDICO	\$ 1.656.232	18/01/2022	30/07/2022	\$ 10.655.093

1.1.3 Apoyo a la supervisión

Se contrato un personal para el apoyo a la supervisión con las siguientes actividades:

- Se realizo Seguimiento a la ejecución de cuentas, contabilidad, gastos mes a mes y otros aspectos establecidos por Gesproy y planeación del proyecto.

- Se Realizo seguimiento a las etapas y/o estrategias del proyecto.
- Se elaboro los informes que se soliciten por la dirección del proyecto.
- Se Velo por el desarrollo del proyecto, el cumplimiento de las metas y levantar alertas a la dirección del proyecto.
- Se elaboro y se presentaron informes requeridos a las entidades pertinentes
- Las demás que sean pactadas de conformidad con las necesidades del contrato

El 18 de enero se contrató el apoyo a la supervisión de la siguiente forma:

CEDULA	CONTRATISTAS	CARGO	INGRESO MENSUAL	TOTAL, CONTRATO	INICIO	FIN
1080290202	JENNIFER MONTERO VARGAS	APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348	\$ 21.034.146	17/01/2022	30/09/2022

1.2 Infraestructura para la investigación dotada

1.2.1 Adquirir equipos de software para el laboratorio


Adquirir equipos de software -aporte USCO -Especie:

La Contrapartida de aporte en especie de la Universidad Surcolombiana de los equipos a cargo del Laboratorio de Neurocognición de la Universidad Surcolombiana desde el 3 de marzo del 2021 Proceso que se realizara tramite de solicitud de certificación de aporte especie USCO, de los siguientes equipos en el mes de febrero del 2022, valor de los 3 años por \$202.983.583 y lo que se lleva ejecutado es de \$62.022.761

Tramite a solicitar de certificación en el mes de febrero del 2022 por los siguientes equipos utilizados en la ejecución del proyecto de laboratorio de Cognición USCO.

- ✓ 1 y 2 Sistema ActiveTwo Biosemi: "Sistema de medición biopotencial con 64 electrodos activos para electroencefalografía (EEG) - Adquirido en 2017; 8 ACTI 6 OCTAL MODULE (8X8); 2 unidades de 32 x PIN-type active sensor on 68-pole conector Este sistema es mediante el cual se hará el registro electroencefalográfico (psicofisiológico) de los sujetos de estudio en las tres fases de evaluación.
- ✓ 2 computadores Portátiles, "Procesador: Intel® Core™ i5-4590 or AMD FXTM 8350, equivalente or better. Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 970 or AMD Radeon™ R9 290 equivalente or better. (View the complete lista). Memoria: 4 GB

- ✓ RAM or more. Salida de video: DisplayPort 1.2 or newer. Puertos USB: 1x USB 3.0 or newer port. Sistema operativo: Windows® 10.
- ✓ E-prime 3.0 E-Prime V.3 Licencia Perpetua Académico Nueva para un usuario, idioma Ingles, Entrega de Llave-USB.

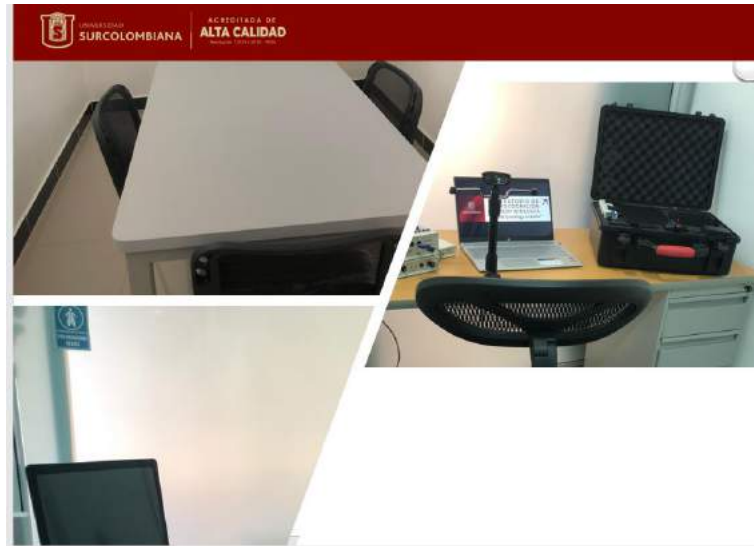

1.2.3 Adquirir equipos de software-Aporte del SGR

Para cumplir con la compra de equipos en la universidad de la Amazonia por el incremento del costo del Biosemi se debió realizar una resignificación de las actividades de la siguiente forma:

Se solicito una evaluación del comité técnico científico por parte del coordinador del Proyecto BPIN 2020000100011, presupuestal de las actividades 1.2.1 y 2.1.3 del proyecto en mención de aspectos conforme lo recomendado por el Comité Técnico Científico del proyecto en la Sesión 007 del 07 de julio de 2021; La recomendación consiste en resignificar los costos de las actividades “Actividad 1.2.1 Adquirir los equipos y software para el laboratorio” y “2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio”.

Solicitud 0026 de dos modificaciones del proyecto en mención conforme las recomendaciones del Comité de Gestión y Comité Técnico Científico. Atendiendo a lo concluido con la secretaria técnica CT&I -Sistema General de Regalías de Min Ciencias en la Mesa Técnica del 21 de julio de 2021, las modificaciones en mención no implican ajustes según lo establecido en la guía de orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión, por lo tanto, corresponden a modificaciones que hace directamente el ejecutor.

La primera modificación corresponde a la resignificación metodológica de las actividades 2.1.2 y 2.1.3, para ampliar el horizonte de tiempo de las actividades y modificar el diseño metodológico adaptando el proyecto al contexto de pandemia sin afectar el alcance, indicadores, productos, ni impacto del proyecto.

<https://drive.google.com/file/d/1oEgOdIpX9bO3-3m0LQt-bYiZU7rRTfja/view?usp=sharing>

La segunda modificación consiste en la resignificación presupuestal de las actividades 1.2.1 y 2.1.3, dónde se ajusta el número de insumos y accesorios a comprar y se redistribuyen rubros entre las actividades en mención, a razón de alzas en los precios del mercado.

Surge de la necesidad de cambio de costos entre las actividades “Actividad 1.2.1 Adquirir los equipos y software para el laboratorio” y “2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio”. En resumen, la relación de la modificación se totaliza así:

<https://drive.google.com/file/d/1oEgOdIpX9bO3-3m0LQt-bYiZU7rRTfja/view?usp=sharing>

	TOTAL	Diferencia	Computo de diferencias
Relación de requerimientos originales Actividad 1.2.1 Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$251.845.491	-\$ 48.270.129	\$ 750.735
Relación de requerimientos recomendados Actividad 1.2.1 Adquirir los equipos y software para el laboratorio	\$300.115.620		
Relación de requerimientos originales Actividad 2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$203.275.804	\$ 49.020.864	
Relación de requerimientos recomendados Actividad 2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.	\$154.254.940		

Esta modificación se argumenta en el documento “Resignificación presupuestal de las actividades 1.2.1 y 2.1.3 del proyecto “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ” con BPIN 2020000100011” emitido por el Comité de Gestión, y el documento “Análisis técnico científico de la resignificación presupuestal de las actividades 1.2.1 y 2.1.3 del proyecto “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ” con BPIN 2020000100011” emitido por el Comité Técnico Científico, ambos documentos anexos a este oficio.

Vale recalcar que según lo analizado por los comités que las modificaciones no comprometen el alcance de los objetivos, los indicadores, ni los productos del proyecto.

De esta forma el incremento dentro del convenio suscrito con la universidad de la Amazonia esta la compra de unos equipos de cómputo, Sistema Ative Biosem, sistema de almacenamiento externo, impresora y E. prime, sistema de Gafas de rastreo ocular y descansa barbillas, y están en proceso de compra con el proveedor exclusivo DE LA ROSA RESEACH. (proceso del convenio de La USCO Y LA AMAZONIA ya descrito con anterioridad**)

En la compra de equipos en particular la del equipo de biosemi de la Amazonia esta pendiente la aprobación de un otro por la USCO, debido al incremento según la cotización con una diferencia de 60 millones para su compra, de un valor de 238 millones a 300 millones adicional, cotización DE LA ROSA REARCH como proveedor exclusivo. Los equipos de computo, impresoras de la USCO no se ha logrado comprar por alto costo en el mercado y poca existencia de los mismos, se considera realizar un solicitud al comité tecnico científico y gestión un mayor valor para la compra de estos equipos.

El 24 de Enero de 2022 se firmó el Otrosi No. 2, para girar el recurso del convenio entre la Uniamazonia y la USCO.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio

2.1 Artículos de investigación

2.1.1 *Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.*

Se realiza el proceso de socialización del proyecto “Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano Huila, Caquetá” para esta actividad se contrata a VIPS 270 A2021 Aura Marcela Cuenca y otros investigadores contratados en el proyecto como Duvan gomez, Leydi Tatiana Padilla y Coordinador Alfredis gonzalez Hernandez .

<https://drive.google.com/file/d/1BRgq1NEQlqKN6vhTuJkGXW3mt54tECZg/view?usp=sharing>

Se realiza socialización con la Fundación Caya el 29 de junio de 2021, dentro de esta actividad se utiliza el rubro aportado por la Universidad Surcolombiana con la comunidad de la Iglesia Asamblea de Dios, el 05 de Julio en el barrio Centro-Altico y el 11 de Julio de 2021 en el barrio Las Palmas, con la iglesia Dios es Amor el 05 de julio de 2021, con los asistentes de la comunidad del barrio La Rioja el 12 de Julio de 2021. La socialización consiste en contar a la comunidad de adultos mayores que se albergan en diferentes centros de acopio, reunión, organizaciones y fundaciones de adultos mayores acerca de los beneficios de la participación dentro del proyecto que consiste en acceso a diferentes valoraciones cognitivas gratuitas realizadas por profesionales y un equipo clínico

interdisciplinar de los diferentes procesos cognitivos como atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje y habilidades visoespaciales para identificar si existe deterioro y el nivel de afectación según la edad cronológica y años de escolaridad del participante. Los interesados en participar se inscriben en un listado en físico para que los evaluadores posteriormente hagan el proceso de acercamiento y citación personalizada según disponibilidad de espacio en el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de acuerdo a la disponibilidad de los contratistas que realizan las respectivas evaluaciones.

Los listados en físico se ingresan en una Hoja de Cálculo en una carpeta Drive en la plataforma *Google Suite* en el correo estudiosneurocognicion@usco.edu.co donde su almacenamiento, actualización se realiza en estrictas condiciones de confiabilidad de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia.

Dentro de esta actividad queda pendiente la socialización con la dependencia encargada del trabajo con adultos mayores en la ciudad de Neiva, Huila de la Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión cuya solicitud de espacio para socialización se radicó el 13 de julio de 2021 y la cual el equipo de trabajo está a la espera de pronta respuesta para realizar el acercamiento con la dependencia

Se realiza el proceso de socialización del proyecto “Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano Huila, Caquetá” en el Departamento del Huila en la ciudad de Neiva en el hogar geriátrico La Alegría de los abuelos el 05 de agosto de 2021, Iglesia Jesucristo es nuestra última esperanza el 02 de agosto de 2021, Iglesia alianza cristiana y misionera el 06 de agosto de 2021, socialización en grupo familiares Neiva el 14 de agosto de 2021, socialización iglesia Pentecostal sede Pedregal, en la Fundación Emprendedores del Futuro Colombia el 10 de agosto de 2021, con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia el 28 de septiembre de 2021, Fundación mejor vivir el 29 de septiembre y la fundación Funipsi el 01 de octubre de 2021, con la Socialización La Esperanza, Vida alternativa el 06 de octubre de 2021. Socialización del proyecto a estudiantes vinculados a semilleros de investigación del programa de psicología el 29 de octubre de 2021.

En el Departamento del Caquetá, en Florencia con la finalidad de divulgar la información e invitación a participación del proyecto de investigación se desarrollaron diferentes actividades, entre ellas se encuentra el diseño de volantes publicitarios, divulgación de la información por redes sociales, divulgación de la información entre estudiantes pertenecientes a la universidad de la Amazonia y encuentros con líderes estratégicos dentro de la ciudad de Florencia para la solicitud de espacios de socialización.

En la Ciudad de Florencia se contrata a VIPS 285 A2021 EDUARDO FORERRO Y VIPS 284 A2021 NATHALIA CALCETO.

<https://drive.google.com/drive/folders/13aM1DFpknqwcQ5VB4GkEWYIeQStBQvPt?usp=sharing>

Se realizaron socializaciones en la Iglesia nuestra señora madre de la iglesia Juan XXIII el 15 de agosto de 2021, Grupo de oración de la iglesia católica Lazos de amor Mariano el 15 de agosto de 2021, Iglesia Alianza Cristiana y misionera (18/08/21), Radio, Universidad de la Amazonia 20 de agosto de 2021. Se realizó la invitación a los profesores, administrativos y estudiantes mayores de 50

años de la Universidad a participar en el proyecto de investigación. Con la Subsecretaria de cobertura Educativa el 08 de septiembre de 2021, quien ofreció los espacios de socialización del proyecto, posterior al inicio de su programa de Alfabetización al adulto mayor. Con la secretaria de inclusión y reconciliación social el 09 de septiembre de 2021, dicha dependencia facilitó una base de datos de 3.200 adultos mayores del programa del Adulto mayor ofrecido por la alcaldía en Florencia para realizarles la invitación al proyecto. La Institución educativa “Jorge Eliecer Gaitán” el 20 de septiembre de 2021 quienes abrieron un espacio para la socialización del proyecto a los profesores de su institución. En la Institución educativa “Jorge Eliecer Gaitán” sede Bosco el 22 de septiembre de 2021, se realizó la socialización del proyecto a los profesores de su institución. En la Institución educativa “Juan XXIII” el 02 de noviembre de 2021, con coordinador de convivencia y profesores de la institución. En el Hogar comunitario Sector E2 el 16 de noviembre de 2021 con la comunidad perteneciente a la junta de acción comunal Barrio Nueva Colombia a cargo de la presidenta María Moreno.

La socialización consiste en contar a la comunidad de adultos mayores que se albergan en diferentes centros de acopio, reunión, organizaciones y fundaciones de adultos mayores acerca de los beneficios de la participación dentro del proyecto que consiste en acceso a diferentes valoraciones cognitivas gratuitas realizadas por profesionales y un equipo clínico interdisciplinar de los diferentes procesos cognitivos como atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje y habilidades visoespaciales para identificar si existe deterioro y el nivel de afectación según la edad cronológica y años de escolaridad del participante. Los interesados en participar se inscriben en un listado en físico para que los evaluadores posteriormente hagan el proceso de acercamiento y citación personalizada según disponibilidad de espacio en el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de acuerdo con la disponibilidad de los contratistas que realizan las respectivas evaluaciones.

Los listados en físico se ingresan en una Hoja de Cálculo en una carpeta Drive en la plataforma *Google Suite* en el correo estudiosneurocognicion@usco.edu.co donde su almacenamiento, actualización se realiza en estrictas condiciones de confiabilidad de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia.



2.1.2 Selección de los sujetos de estudio

En el desarrollo de esta actividad se vincularon las siguientes contratistas como investigadores dentro del proyecto

CONTRATISTAS 2021

Numero de contrato	CONTRATISTA	OBJETO
VIPS 204 A2021	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 206 A2021	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 160 A 2021	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ MONTEALEGRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 205 A2021	BONILLA SANTOS JASMIN	S PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO
485 VIPS ±B2021,	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 285 A2021	ARNULFO EDUARDO ALDANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 286 A2021	LAURA NATHALIA CALCETO GRAVITO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 360-2021	RUDY DANIELA RODRIGUEZ VAQUIRO	PO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÁN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓ
VIOPS 359 B 2021	RUDY MARCELA SANCHEZ GUARNIZO	PO INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÁN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓ
RESOLUCION 2021 001 29 DE JULIO	MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ	INVESTIGADOR/A PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD CON DOCTORADO
VIPS 412B 2021	CUENCA PAREDES AURORA MARCELA	PRESTACIÓ DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA EN EL PROYECTO TITULADO “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO PARA LA DETECCIÓN EMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS MAYORES DEL URCOLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ” con BPIN 2020000100011
VIPS 410 B2021	LAURA DANIELA OLCUNCHE NOSCUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL

VIPS 456 B 2021

DORIAN GISELA
CALAINVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS
AFINES

Se realizan las siguientes actividades:

2.1.2.1 Introducción al protocolo y formación en evaluación neuropsicológica, psicofisiológica y neurofisiológica

2.1.1.2 Reuniones equipo de profesionales

Previo a la reunión y presentación de la propuesta del protocolo de evaluación neurocognitiva ante comité técnico-científico se realizan en el mes de abril y mayo unas series de reuniones con una psicóloga doctora en psicología con énfasis en neurociencia cognitiva, una psicóloga con formación magister en neuropsicología clínica, una psicóloga con formación magister en psicología clínica, dos psicólogos investigadores profesionales con amplia experiencia en investigación con formación en neurociencia social y epidemiología y con el coordinador del proyecto con el objetivo de tomar decisiones respecto a la organización logística del trabajo de campo, definir los puntos de corte de las escalas de tamizaje para síntomas de depresión, signos y síntomas de enfermedades cerebrovasculares y otras etiologías clínicas que sean de exclusión para condición del estudio.

Como producto de las reuniones quedó el Acta 001 del 25 del 01 de abril 2021 reunión equipo de profesionales, el Acta 002 del 05 de abril de 2021 reunión equipo de profesionales segundo encuentro, Acta 003 06 de abril de 2021 reunión equipo de profesionales tercer encuentro.

2.1.2.3 Creación de manual y protocolo de valoración neuropsicológico, psicofisiológico y neurofisiológico

Se crea un manual que contiene un compendio de pruebas y escalas neuropsicológicas útiles en la evaluación de la actividad cognoscitiva de los participantes del estudio. Este manual contiene el procedimiento para recolectar la información sociodemográfica, clínica, escalas de tamizaje para síntomas de depresión, enfermedades cerebrovasculares, identificación de dicromatismo, analizar los síntomas y signos de dificultades cognitivas generales, atención, percepción, lenguaje, memoria y praxias. El manual también, recopila una serie de escalas de identificación subjetiva de problemas de memoria y capacidad o habilidades de la vida diaria de los participantes.

Adicional se crea el protocolo para evaluación psicofisiológica, toda vez que los protocolos han sido pilotados y retroalimentados, se preparan los manuales y envían para entrenamiento con el contratista

asignado para la Universidad de la Amazonía. Se realiza entrenamiento con prácticas de laboratorio, lectura de manuales y reuniones para resolución de dudas.

Una vez que termina el entrenamiento en obtención de señales. Se inicia el proceso de capacitación y seguimiento al aprendizaje de los procesos correspondientes al protocolo de pre-procesamiento y procesamiento de la señal EEG. Para ello, se diseña el material de entrenamiento, manuales y recomendaciones; este material se pone en práctica en el usando el software MATLAB y la caja de herramientas EEGLAB como pilotaje para identificar oportunidades de mejora.

Finalmente, se preparan los documentos y envían para entrenamiento con el contratista asignado para la Universidad de la Amazonía. Se realiza entrenamiento con prácticas virtuales, lectura de protocolos y reuniones para resolución de dudas. Los manuales y materiales del protocolo quedan cargados al Drive del proyecto Marcador Cognitivo con acceso al equipo profesionales y contratistas para consulta y estudio.

2.1.2.4 Proceso de inducción y capacitación al protocolo

Luego de diseñado el material para realizar la inducción y socialización protocolo de evaluación neuropsicológica al equipo de trabajo los días 02 de junio de 2021, 03 de junio de 2021, 10 de junio de 2021 y el 17 de junio de 2021. Se realizan unos encuentros para capacitar al equipo de trabajo de evaluadores. Durante estos encuentros se socializa el método del estudio, las fases, los instrumentos y las estrategias en la identificación de los perfiles clínicos de deterioro cognitivo leve y sus subtipos. Se enseña a realizar una adecuada entrevista clínica, identificar antecedentes clínicos y neurológicos subyacentes, quejas subjetivas de cambio de pensamiento y memoria. Cómo identificar las funciones cognitivas afectadas y preservadas, seguimiento del deterioro, así como la evolución. Cómo conocer si el participante tiene pérdida de interés en aficiones, actividades; repetición preguntas y comentarios, dificultad para aprender a usar herramientas, aparatos o dispositivos y en general declive en el rendimiento funcional.

2.1.2.5 Conformación comité técnico científico

Se cita y realiza una reunión con el fin de elegir los integrantes del Comité Técnico Científico quiénes tendrán como responsabilidad, coordinar las actividades y procesos para garantizar la correcta sincronización de actividades entre los proyectos del programa. Solucionar las diferencias que se presenten en los equipos de trabajo involucrados en los diferentes proyectos del programa. Recomendar ajustes a los cronogramas, equipos de trabajo, plan de actividades, y entregables de los diferentes proyectos del programa. Regulación de los beneficios económicos y pérdidas que surjan de la explotación de los resultados. Informar a las partes sobre la obligación de la confidencialidad del programa y los proyectos que lo conforman y finalmente velar que en toda publicación, actividad

o material divulgativo relacionado con el programa y los proyectos que lo conforman, se otorguen los créditos a las instituciones patrocinadoras.

Producto de la reunión se firma ACTA 001 el 08 de junio de 2021 se eligen los integrantes del comité y se socializa el proyecto con los integrantes del Huila-Caquetá. Durante la reunión se socializa el protocolo de investigación y los manuales diseñados para la evaluación siendo revisados y aprobados por el respectivo comité.

Se realizan dos reuniones adicionales para realizar seguimiento y tomar decisiones referentes al proceso de evaluación con el protocolo de valoración cognitiva y psicofisiológica del proyecto mediante ACTA 002 del 17 de junio de 2021 y ACTA 003 del 23 de junio de 2021.

2.1.2.6 Aportar en la ejecución del algoritmo de decisión clínica para la selección de sujetos de estudio y asignación de casos y controles

Se realiza reuniones con el equipo de contratistas evaluadores el 13 de junio de 2021 para el control, calidad, sistematización y tabulación de los resultados de las evaluaciones del 28 de junio al 12 de julio.

Se evalúa los participantes que asisten desde diferentes sectores y comunas de la ciudad de Neiva, Huila a través de una entrevista clínica que explora los datos sociodemográficos, los antecedentes médicos, indagación sobre el consumo de sustancias como alcohol y/o drogas, manifestaciones subjetivas de pérdida de memoria por parte del participante, aplicación de escalas de tamizaje para identificar síntomas de depresión geriátrica y riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares. Se aplican pruebas objetivas que evalúan memoria episódica, memoria a corto plazo de conjunción, valoración cognitiva general, evaluación de componentes como lenguaje denominación, memoria de lista de palabras, evocación de lista de palabras, praxias constructivas de copia y evocación, pruebas de atención y funciones ejecutivas, así como escalas que descartan dificultades en habilidades de la vida diaria y evalúa la independencia de los participantes en actividades funcionales.

2.1.2.6 Aportar en la ejecución del algoritmo de decisión clínica para la selección de sujetos de estudio y asignación de casos

Se realizan reuniones con el equipo evaluador, equipo de profesionales con formación en neurociencias cognitivas, en neuropsicología clínica y estadística. Durante las reuniones se abre el espacio de discusión sobre el perfil de cada participante evaluado al corte de la reunión referente a los criterios de inclusión y exclusión a los grupos de estudio. Se realizan estudios de caso y se toman

decisiones clínicas que sirven como insumo para la realización de informes a la población beneficiada de las evaluaciones.

2.1.2.7 Apoyar en la elaboración de informes de los resultados de las evaluaciones

Reunión de revisión de avances en protocolos de evaluación y apoyo en la elaboración de los informes resultados de las evaluaciones con el equipo de profesionales durante 02 de julio de 2021, 09 de julio de 2021 y 16 de julio de 2021.

Para poder cumplir con esta actividad es necesario una serie de eventos

1.3.1 Introducción al protocolo y formación en evaluación neuropsicológica, psicofisiológica y neurofisiológica

Dentro del marco del proyecto se ve la necesidad de realizar una adecuada y constante capacitación de los psicólogos profesionales en el área de investigación, que permita obtener los resultados esperados de las pruebas aplicadas. Para lo anterior, se han realizado diferentes actividades, entre ellas se encuentra las capacitaciones de aplicación de las pruebas neuropsicológicas, revisión de aplicación de pruebas con un sujeto de estudio, capacitaciones sobre calificación y análisis de resultados, capacitaciones sobre elaboración de informes, estudios de caso y reuniones semanales que permitieran realizar un seguimiento de la ejecución de las valoraciones. Se añade que, debido al ingreso de nuevos evaluadores en el transcurso del tiempo, se realizaron nuevamente algunas capacitaciones ya realizadas previamente.

En Neiva, Huila se coordinó el desarrollo de diferentes actividades de formación para el equipo de trabajo de ambos departamentos que fortaleciera el proceso de evaluación, se realizó una capacitación de primeros auxilios psicológicos el 08 de octubre de 2021, se realizaron estudios de discusión de casos especiales tomados de las evaluaciones los días 17 de septiembre, 01 de octubre, 19 de noviembre, 26 de noviembre y 12 de noviembre.

El día 15 de octubre, se realizó una capacitación de refuerzo en prueba de depresión geriátrica de Yesavage y test de Dvorine. Por otro lado, se realizó una capacitación en la plataforma SISNE del grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia el 24 de noviembre de 2021, dicha capacitación guía en la correcta forma de sistematizar los datos producto de las evaluaciones realizadas. Para el día 03 de diciembre se hizo una capacitación de refuerzo y se resolvieron dudas respecto a la aplicación del Trail Making Test (TMT-A y B)

Las actividades desarrolladas en Florencia, Caquetá fueron socialización y supervisión de la correcta aplicación del protocolo el 12 de agosto, presentación del proyecto y metodología a utilizar y revisión de protocolos 13 de agosto, reunión de equipo de trabajo de evaluadores con el objetivo de definir metas de evaluación 20 de agosto, capacitación sobre elaboración de informes 27 de agosto, reunión

de equipo de trabajo, presentación y entrega de responsabilidades Florencia 03 de septiembre, reunión de equipo de trabajo para capacitación sobre calificación de pruebas y elaboración de informes 10 de septiembre, supervisión de aplicación del protocolo – Florencia, Caquetá los días 14, 15 y 16 de septiembre. Reunión de equipo de trabajo para reunión de equipo de trabajo para retroalimentación de aplicación de pruebas neuropsicológicas y redacción de informes 17 de septiembre, reunión para revisión de protocolos 24 de septiembre, capacitación de utilidad de pruebas neuropsicológicas 01 de octubre, capacitación de aplicación de pruebas neuropsicológicas – Historia clínica, Yesavage y Hachiski 05 de octubre, capacitación de aplicación de pruebas neuropsicológicas –Dvorine, Test de memoria de trabajo visual para formas y formas con color 08 de octubre, capacitación de aplicación de pruebas neuropsicológicas – ACER, Genograma, escalas de la vida diaria CERAD el 12 de octubre, supervisión de aplicación del protocolo – Florencia, Caquetá 13 de octubre, capacitación de examen mental el 15 de octubre, revisión de protocolos e impresión diagnóstica 22 de octubre, capacitación de entrega de informes y análisis del Monumental a cargo de la Neuropsicóloga Yeing Cardona el 29 de octubre, revisión de protocolos e impresión diagnóstica los días 29 de octubre, 05, 12 y el 19 de noviembre.

1.3.1.1 Reuniones equipo de profesionales

Con el objetivo de hacerle seguimiento y darles apoyo a las personas encargadas de las valoraciones cognitivas. Periódicamente se realizan reuniones de revisión, seguimiento y toma de decisiones por parte del equipo de clínicos conformado por psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos clínicos y asistentes profesionales.

Para el día 03 de septiembre se realizó una reunión para discutir casos específicos con el equipo de trabajo de evaluadores y equipo expertos en neuropsicología y psicología clínica del Huila y Caquetá acerca de la correcta clasificación de casos y controles. Para el día 10 de septiembre se hizo una reunión con el equipo clínico con el fin de discutir algunos participantes evaluados según los criterios de clasificación de casos y controles especificados por el protocolo de investigación. Para los días 10, 13 y 14 de septiembre, se hizo reunión el equipo clínico para discutir los diferentes casos específicos evaluados y reportado por el equipo de trabajo evaluador. El 17 de septiembre se hizo reunión de revisión de los criterios de exclusión de casos clínicos únicos y especiales producto de las evaluaciones en Huila y Caquetá.

Se realizó una reunión equipo de trabajo clínico el 07 de octubre de 2021 para coordinar con la neuropsicóloga encargada de guiar el proceso de elaboración y revisión de informes en Florencia, los elementos necesarios al momento de elegir los casos y controles, de tal manera que se manejen unos únicos criterios en ambos departamentos. Luego, para discutir la articulación de las funciones de médicos especialistas en psiquiatría se programó una reunión el 12 de octubre con los investigadores del proyecto y los clínicos.

Para el día 10 de noviembre se realizó una reunión para revisar un protocolo para analizar la puntuación estándar y su baremo poblacional según características de edad y escolaridad durante las

evaluaciones neuropsicológicas. El protocolo reposa en físico en la sede Altico de la Universidad Surcolombiana.

También se requirió gastos de viajes para las actividades de Socialización del proyecto con los diferentes Actores.

Dentro de esta actividad se ha requerido la ejecución de Gastos de viajes para los participantes para la selección de los sujetos, recogiéndolos y transportarlos desde el lugar de residencia hasta el laboratorio para la evaluación y retornarlos al lugar de residencia en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Mediante avances realizados al proyecto para la ciudad de Neiva y Florencia.

En esta actividad se requirió fotocopiar los protocolos de evaluación para la aplicación a los participantes en el mes de Julio, agosto y septiembre y octubre del 2021.

2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio

Para esta actividad se contrata las siguientes contratistas, teniendo en cuenta que algunos de ellos ya vienen con el proyecto y dentro de su plan de trabajo esta acompañar, realizar y ejecutar esta actividad.

CONTRATISTAS DE LA ACTIVIDAD 2021

Numero de contrato	CONTRATISTA	OBJETO
VIPS 204 A2021	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 206 A2021	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 160 A 2021	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ MONTEALEGRE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIONAL
VIPS 205 A2021	BONILLA SANTOS JASMIN	PROFESIONAL COMO INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CON DOCTORADO
485 VIPS ±B2021,	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 285 A2021	ARNULFO EDUARDO ALDANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL
VIPS 286 A2021	LAURA NATHALIA CALCETO GRAVITO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIOANAL

VIPS 360-2021	RUDY DANIELA RODRIGUEZ VAQUIRO	INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
VIOPS 359 B 2021	RUDY MARCELA SANCHEZ GUARNIZO	INVESTIGADORA PROFESIONAL EN ÁREAS AFINES CON ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
RESOLUCION 2021 001 29 DE JULIO	MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ	Investigador/a profesional en ciencias de la salud con doctorado
VIPS 412B 2021	CUENCA PAREDES AURORA MARCELA	INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA
VIPS 410 B2021	LAURA DANIELA OLCUNCHE NOSCUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGADOR PROFESIONAL
VIPS 456 B 2021	DORIAN GISELA CALA	INVESTIGADORA PROFESIONAL CON MAESTRÍA EN AREAS AFINES
VIPS 583 B 2021	ADRINA SANDOVAL OLIVERA	INVESTIGADOR PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA

Se evalúa los participantes que asisten desde diferentes sectores y comunas de la ciudad de Neiva, Huila a través de una entrevista clínica que explora los datos sociodemográficos, los antecedentes médicos, indagación sobre el consumo de sustancias como alcohol y/o drogas, manifestaciones subjetivas de pérdida de memoria por parte del participante, aplicación de escalas de tamizaje para identificar síntomas de depresión geriátrica y riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares. Se aplican pruebas objetivas que evalúan memoria episódica, memoria a corto plazo de conjunción, valoración cognitiva general, evaluación de componentes como lenguaje denominación, memoria de lista de palabras, evocación de lista de palabras, praxias constructivas de copia y evocación, pruebas de atención y funciones ejecutivas, así como escalas que descartan dificultades en habilidades de la vida diaria y evalúa la independencia de los participantes en actividades funcionales.

Las evaluaciones se han venido realizando constantemente en la medida que se consiguen participantes. Dichas evaluaciones se programan de lunes a viernes en horarios de 8:00 a.m.– 12:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

2.1.2.6 Aportar en la ejecución del algoritmo de decisión clínica para la selección de sujetos de estudio y asignación de casos y controles

Se realiza reuniones con el equipo de contratistas evaluadores el 13 de junio de 2021 para el control, calidad, sistematización y tabulación de los resultados de las evaluaciones del 28 de junio al 12 de julio.

Se evalúa los participantes que asisten desde diferentes sectores y comunas de la ciudad de Neiva, Huila a través de una entrevista clínica que explora los datos sociodemográficos, los antecedentes médicos, indagación sobre el consumo de sustancias como alcohol y/o drogas, manifestaciones subjetivas de pérdida de memoria por parte del participante, aplicación de escalas de tamizaje para identificar síntomas de depresión geriátrica y riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares. Se aplican pruebas objetivas que evalúan memoria episódica, memoria a corto plazo de conjunción, valoración cognitiva general, evaluación de componentes como lenguaje denominación, memoria de lista de palabras, evocación de lista de palabras, praxias constructivas de copia y evocación, pruebas de atención y funciones ejecutivas, así como escalas que descartan dificultades en habilidades de la vida diaria y evalúa la independencia de los participantes en actividades funcionales.

Se realizan reuniones con el equipo evaluador, equipo de profesionales con formación en neurociencias cognitivas, en neuropsicología clínica y estadística. Durante las reuniones se abre el espacio de discusión sobre el perfil de cada participante evaluado al corte de la reunión referente a los criterios de inclusión y exclusión a los grupos de estudio. Se realizan estudios de caso y se toman decisiones clínicas que sirven como insumo para la realización de informes a la población beneficiada de las evaluaciones.

A la fecha en el municipio de Neiva, Huila se han reportado 174 evaluaciones completas de las cuales de manera preliminar 77 se consideran de inclusión para el estudio y 97 de exclusión. Para el municipio de Florencia, Caquetá hay 245 evaluaciones de las cuales 100 son de inclusión y 145 de exclusión.

1.4.2 Apoyar en la elaboración de informes de los resultados de las evaluaciones

Reunión de revisión de avances en protocolos de evaluación y apoyo en la elaboración de los informes resultados de las evaluaciones con el equipo de profesionales durante 02 de julio de 2021, 09 de julio de 2021 y 16 de julio de 2021.

Los informes de evaluaciones producto de las aplicaciones de los participantes se han venido realizando por parte de los contratistas y se almacenan en el correo estudiosneurocognicion@usco.edu.co para que dos neuropsicólogas, una en el Huila y otra en el Caquetá se encarguen de dar el visto bueno para firma, socialización y ser entregados.

En el consolidado del proyecto se han evaluado 249 personas, sistematizadas se tienen 180 participantes.

De inclusión en base a los códigos seleccionados, tienen 130, 50 por sistematizar,

Dentro del proyecto se requiere 120 adultos mayores de inclusión, divididas en dos grupos, el grupo control (adultos con envejecimiento normal) 40 personas y el grupo de DCL 80 personas

En Florencia se tienen los siguientes resultados

DCL = Deterioro Cognitivo Leve

121 personas de inclusión, 110 personas de exclusión ,15 personas que no continuaron, 3 dudosos (personas por confirmar si son de inclusión o exclusión), Total 249 participantes evaluados.

Anexos:

Actas de comité técnico científico

<https://drive.google.com/drive/folders/1uEoIZww-a6ntmW3ymnOvawDw9oktKE87?usp=sharing>

Actas

Comité administrativo

Contratos talento Humano

<https://drive.google.com/drive/folders/13FpCc42KAgKeMhNFE9FOWSSdsO9pXAPO?usp=sharing>

Contrato de La rosa resorth-porceso contractual

<https://drive.google.com/drive/folders/1gmCBXIUZrwrF0Fla0OLVxBkQJEy8N8is?usp=sharing>

Informes por mes de los investigadores y evidencias

https://drive.google.com/drive/folders/1IjzfV_QhZEwuvMUjWPFyVxq4bzInF7Za?usp=sharing

En el mes de enero del 2022 se realizaron las evaluaciones realizadas a la fecha, se organizó el cronograma de trabajo de evaluaciones neuropsicológicas y psicofisiológicas pendientes para el año 2022

Se realizó una introducción al protocolo y revisión aleatoria de la evaluación neuropsicológica de los evaluadores, se hizo revisión de claridad en criterios de clasificación diagnóstica

Se organizó y revisó la hoja de cálculo de los protocolos sistematizados en el año 2021 para

Revisar la calidad de la sistematización de los protocolos subidos a google drive.

Entre los días 27 al 29 de enero, Capacitación sobre las subpruebas del CERAD.

Dar a conocer sobre la forma de aplicar, calificar e interpretar las subpruebas del Consorcio para el Establecimiento de un Registro de la Enfermedad de Alzheimer.

Explicación de la realización de los informes psicológicos que se entregan a los participantes del proyecto.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JoxDBFBtEDSZAzx5NihFcFNfVhoAQORj/edit#gid=2112719320>



UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA



Universidad de la
Amazonia

Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer en adultos mayores del sur colombiano Huila, Caquetá.
BPIN 2020001000011

27-01-2022 Reunión presencial equipo de trabajo Se revisó las evaluaciones realizadas a la fecha, se organizó el cronograma de trabajo de evaluaciones.

Generación de alianzas estratégicas para la divulgación de la información y socialización del proyecto investigativo.

Revisión de bases obtenidas con anterioridad con la finalidad de citar adultos mayores restantes a la participación del proyecto de investigación.

INFORME FINANCIERO

Costo total de la alternativa: \$ 2.306.074.577,82

- OBJETIVO ESPECÍFICO

1. *Mejorar las capacidades investigativas de las instituciones de educación superior públicas vinculadas*

Costo: \$ 769.277.280

1.1 Infraestructura para la investigación adecuada

Costo: \$ 141.900.610

Ejecutado: \$60.949.338

Porcentaje de 42%

1.1.1 Adecuar infraestructura para laboratorio

Costo: \$ 62.401.482

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Infraestructura	\$ 57.172.748,00	\$0	0%
Infraestructura-Efectivo-UA	\$5.228.734,00	\$0	0%
TOTAL	\$ 62.401.482	\$0	0%

Infraestructura:

Se realizó el convenio especial de cooperación suscrito entre la universidad Surcolombiana y la universidad amazonia del 27-05-2021 según Oficio 049 de 118-08-2021, RP 103-21221005007 del 26-05-2021 con la Fuente 26003010503 por \$345.778.021 y una orden de pago UA 92577021 registro 26-10-2021, Actualmente en diciembre está en proceso de contratación por parte de la Universidad de la Amazonia. (La universidad Sur colombiana ya realizó el pago está en proceso de ejecución la Universidad de la amazonia como administrador del rubro))

Infraestructura-Efectivo-UA:

Este recurso es un aporte en efectivos de la Universidad de la Uniamazonia está en proceso de contratación; CDP Numero 210001453 expedido el 03/03/2021 de la Uniamazonia.

1.1.2 Administración del proyecto

Costo: \$ 49.686.960

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
MANO DE OBRA CALIFICADA	\$ 49.686.960,00	\$45.712.004	92%

Mano de obra calificada:

*Se contrato un (Asesor administrativo y Contable con contrato Numero VIPS 180 A2021 a nombre de JUAN CARLOS MADRID CALDERON por un valor mensual de \$ 2.484.349 por un valor total de \$22.856.001 el 25-03.2021, con Rubro 2603010503, SPGR 2721del 25.03-2021, C.D. P 103-2121005004 del 2021 a corte del 31/12/2021 se pagó \$22.856.001, se detalla así: Solicitud CDP 2821y 2721 compromiso 2921:

Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Ordenes de Pago
2921	2421, 2821, 3621, 6021, 7721, 9921, 13821	2321, 3221, 5721, 7621, 9821, 15221	85087921, 90098221, 91396721, 91975421, 93703121, 96035021

**Se contrato una persona como Asesora jurídica, con contrato Numero VIPS 179 A 2021 a nombre de LAURA MELISSA POLANIA por un valor de \$ 15,237.334 25-03.2021 por un valor mensual de \$ 1.656.232 del Rubro 2603010503 -SPGR 2721del 25.03-2021, C.D. P 103-2121005004 del 2021, a cortes del 31/12/2021 se pagó \$15.237.334 y se relaciona los siguientes movimientos, compromiso CDP 2821 Y 2721 compromisos 2821:

Cuentas por Pagar	Obligaciones	Ordenes de Pago
2121, 2221, 3521, 6421, 7421, 9821, 14621	1721, 1821, 3121, 6121, 7321, 9721, 14521	84562621, 84563821, 90097321, 91396621, 91975621, 93702421, 96035921

1.1.3 Apoyo a la supervisión

Costo: \$ 29.812.176

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
MANO DE OBRA CALIFICADA	\$ 29.812.176,00	\$ 22.856.002	76%

Mano de obra calificada

**Se contrato una persona para el apoyo a la Supervisión según contrato VIPS 184 A1021 a nombre de RUIZ LEON JHONATAN, Rubro 2603010503 -SPGR 2721 del 25.03-2021, C.D. P 103-2121005004 del 2021, por un valor mensual \$ 2.484.349 por un valor total de \$22.856.001 y a corte del 31/12/2021 se pagó \$ 22.856.001, con CPD 2821 Y 2721 Y Compromiso 3021 y los movimientos detallados son los siguientes:

1.2 Infraestructura para la investigación dotada

Costo: \$ 627.376.662 -Resignificación \$ 675.646.791,00

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Adquirir equipos de software-aporte USCO	\$ 202.983.583	\$62.022.761	30%
Adquirir equipos de software_SGR	\$ 424.393.079/ \$472.663.208 (Resignificación)	288.605.273	68%
TOTAL	\$675.646.791,00	\$344.989.601	51%

Adquirir equipos de software-aporte USCO -Especie:

La Contrapartida del aporte en especie de la Universidad Surcolombiana de los equipos a cargo del Laboratorio de Neuro cognición de la Universidad Surcolombiana desde el 3 de marzo del 2021 Proceso de solicitud de certificación de aporte especie USCO, de los siguientes equipos:

- ✓ 1 y 2 Sistema ActiveTwo Biosemi: "Sistema de medición biopotencial con 64 electrodos activos para electroencefalografía (EEG) - Adquirido en 2017; 8 ACTI 6 OCTAL MODULE (8X8); 2 unidades de 32 x PIN-type active sensor on 68-pole conector por un valor de \$50.000.000; Este sistema es mediante el cual se hará el registro electroencefalográfico (psicofisiológico) de los sujetos de estudio en las tres fases de evaluación.
- ✓ 2 computadores Portátiles, "Procesador: Intel® Core™ i5-4590 or AMD FXTM 8350, equivalente or better. Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 970 or AMD Radeon™ R9 290 equivalent or better. (View the complete list). Memoria: 4 GB
- ✓ RAM or more. Salida de video: DisplayPort 1.2 or newer. Puertos USB: 1x USB 3.0 or newer port. Sistema operativo: Windows® 10, por un valor de \$ 4.635028.
- ✓ E-prime 3.0 E-Prime V.3 Licencia Perpetua Académico Nueva para un usuario, idioma inglés, Entrega de Llave-USB, por un valor de \$ 1.749.300,0.

Por un valor total \$ 56.384.328 por 10 meses de operación del proyecto (En proceso de Certificación de la UNIVERSIDAD SURCOLOBIANA)

Adquirir equipos de software SGR

El 27 de mayo de 2021 con el oficio 049, se solicita el RP y suscribe el convenio de cooperación entre Surcolombiana y la universidad amazonia, por un valor de \$345.778.021, según RP USCO 103-21221005007 del 26-05-2021, Fuente 26003010503, orden de pago UA 92577021 registro 26-10-2021. (Está en proceso de contratación). Se reporta medida que se realiza la adquisición.

Esta actividad le corresponde un valor de \$ 288.605.273 correspondiente de:

OBJETIVO	EQUIPOS Y SOFTWARE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1 y 2	Sistema ActiveTwo Biosemi	\$ 238.476.000,0	\$ 238.476.000,0
1, 2 y 3	Computador Portátil	\$ 8.343.051,5	\$ 16.686.103,0
1, 2 y 3	Sistema almacenamiento ext	\$ 616.325,0	\$ 4.314.275
1, 2 y 3	Impresora multifuncional	\$ 563.965,0	\$ 563.965,0
1 y 2	E-prime 3.0	\$ 6.297.480,0	\$ 6.297.480,0

1 y 2	Gafas con rastreo ocular	\$ 15.173.342,5	\$ 5.173.342,5
1 y 2	Descansa barbilla	\$ 2.364.702,5	\$ 7.094.107,5
TOTAL			\$288.605.273

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

2. Caracterizar los procesos neuropsicológicos los sujetos de estudio y conformar los grupos de estudio

2.1 Artículos de investigación

Costo: \$ 1.319.553.169 – Resignificación \$1.271.283.039,82

2.1.1 Socializar el proyecto a instituciones y entidades vinculadas al proyecto.

Costo: \$9.042.368

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
Mano de obra calificada (U)	\$ 3.312.464	\$ 3.312.464	100%	
Mano de obra calificada (UA) -ef	\$ 3.312.464	0	0%	PENDIENTE DE CERTIFICACION
Mano de obra Coordinador en efectivo (usco)	\$ 2.227.440	0%	0%	PENDIENTE DE CERTIFICACION

Mano de obra calificada (Aporte de La Universidad Surcolombiana en efectivo:

- ✓ Se contrata una investigadora con contrato 270 A 2021 a nombre de AURA MARCELA CUENCA RUBRO 240202020801020101 CDP 102-21210186. (100% ejecutado).
- ✓ El rubro del coordinador en efectivo está en proyectado para el año 2022.

Mano de obra calificada (Aporte de La Universidad Uniamazonia en efectivo:

El recurso está en proceso de giro de la Uniamazonia, ya se emitió Factura por parte de la universidad Surcolombiana con plazo 30 de diciembre para el envío del recurso ((FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, FEUS – 54), por el concepto de TALENTO HUMANO POR HONORARIOS C62 1,00 \$3.312.464,00 0,00 \$3.312. 464,

2.1.2 Seleccionar los sujetos del estudio

Costo: \$ 139.694.394

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	
Aporte en especie Usco	\$ 6.061.944,00	\$0	0%	PTE DE CERTIFICACIÓN
Mano de obra calificada (US) SGR	\$ 78.447.428,68	\$78.447.428	100%	
Mano de obra calificada (US) - Psi	\$ 828.116,00	\$0	0%	
Transporte SGR	16.720.000,00	\$10.562.000	63%	
Materiales	\$ 1.644.406,40	\$0	0%	
Servicio de alojamiento comida y bebidas SGR	35.992.499,00	\$0	0%	
TOTAL	\$ 139.694.394,08	\$82,719428	59%	

Mano de obra calificada (Aporte de La Universidad Surcolombiana en Especies:

El aporte en especies se dejó para certificarse en el mes de diciembre, está en proceso de certificación de los docentes que realizan su gestión en el proyecto, **los docentes son: El coordinador Alfreidis González Hernández y Luisa Fernanda Muñoz Bernal.**

Mano de obra calificada (US) SGR

En esta actividad se contrataron las siguientes personas con sus respectivos contratos y la ejecución realizada:

FECHA	VALOR CONT	CONTRATISTA	CDP	CDP	COMPRO	VLOR ACTIVIDAD	CARGO
-03	32.903.809,00	GONZALEZ MONTEALEGRE RODRIGO ALBERTO	2721	2621	2621	13.029.025	Investigador profesional en psicología VIPS 160 A2021
23/04	16.120.657,00	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO1	2821	2721	3121	9.937.392	Investigador profesional en psicología VIPS 204 A2021
23/04	20.265.653,00	BONILLA SANTOS JASMIN	2821	2721	3221	6.651.841	Investigador profesional en psicología con doctorado VIPS 205 A2021
23/04	9.716.561,00	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA.1	2821	2721	3321	.5.157.380	Investigador profesional en psicología VIPS 206 A2021
26 /06	21.256.092,00	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	3221	3121	3621	\$7.879.253	Investigador profesional en psicología VIPS 285 A2021
26/06	10.268.638,00	CALCETO GARAVITO LAURA NATALIA	3321	3221	372	3.643.710	Investigador profesional en psicología VIPS 286 A2021
04/08	11.666.087,00	PARRA RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	4321	4121	4121	8.216.981	Investigador/a profesional en ciencias de la salud con doctorad001 2021
04/08	13.927.875	RODRIGUEZ VAQUIRO RUDY DANIELA	4321	4121	3921	3.539.490	Investigador/a profesional en áreas afines con especialización MEMORANDO No. 028
04/08	\$ 17.499.125	SANCHEZ GUARNIZO RUDY MARCELA	4321	4121	4021	7.142.500	Investigador profesional en psicología especialización
13/09	3.577.460	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	4321	4121	4821	3.312.464	

01/09	13.249.856,00	OLCUNCHE NOSCUE LAURA DANIELA	4321	4121	4621	9.937.392	Investigador, profesional en psicología VIPS 286 A 2021
TOTAL						\$78.447.428	

✓ **Mano de obra calificada (US) –**

El rubro se proyecta para el 2022

✓ **Viajes**

✓ **Transporte SGR**

Se realizan avances y reconocimientos relacionados al transporte de traslado de personas para evaluación en el proyecto, desde sus lugares de residencia hasta el laboratorio y respectivo retorno; se relacionan así estos movimientos:

Fecha	Recurso	Valor Actual	Saldo por Utilizar	PAGADO	Numero Cuenta	Solicitud CDP	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar
2021-08-19 10:02:05	ACTI - HUILA	2.352.000	-	2.352.000	0550488 4090277 91	4421	4221	4221	3321
2021-09-22 12:57:55	ACTI - HUILA	1.920.000	1.920.000	-	0550488 4090277 91	4421	4221	5021	
2021-10-20 18:55:48	ACTI - HUILA	960.000	-	960.000	0550488 4090277 91	4421	4221	5321	9121
2021-10-20 19:00:30	ACTI - HUILA	960.000	-	960.000	0550488 4090277 91	4421	4221	5421	9021
2021-11-22 19:08:02	ACTI - HUILA	960.000	960.000	-	0550488 4090277 91	4421	4221	6221	

2021-11-22 19:12: 03	ACTI - HUILA	1.200.000	1.200.000	-	0550488 4090277 91	4421	4221	6321	
2021-11-22 19:15: 40	ACTI - HUILA	113.239	113.239	-	0550488 4090277 91	4421	4221	6421	
2021-11-22 19:15: 40	ACTI - PUTUM AYO	846.761	846.761	-	0550488 4090277 91	4421	4221	6421	
2021-11-22 19:18: 39	ACTI - PUTUM AYO	1.340.000	1.340.000	-	0550488 4090277 91	4421	4221	6521	
		10.652.000	6.380.000	4.272.000					

Se ejecutó \$10.562.000 de lo que se ha pagado \$4.272.000 y por pagar \$6.380.000, con los siguientes compromisos: (960.000 -6221, 1.200.000- 6321, 113.239 -6421, 846.761- 6421, 1.340.000 - 6521 de 122 de noviembre y el 19 de agosto del 2021)

- ✓ **Materiales:** se proyectan su compra para el 2021 para compra de Tóner \$ 1.644.406,40
- ✓ **Servicio de alojamiento comida y bebidas SGR:** se reprogramo para el 2022, debido a la que es una actividad donde se realizara un evento y está pendiente perfeccionar los requisitos y el proceso para la selección de los participantes al mismo, y debido a la pandemia Covi 19, no se pudo realizar en las ciudades y países a realizar el evento, por las restricciones.

2.1.3 Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio.

Costo: \$ 1.091.317.270 Reprogramación por \$ 1.043.047.141,74

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Mano de obra calificada	145.165.468	115.899.399	79%
Mano de obra calificada (UA) – especie	\$ 98.2860.485	\$0	0%
Materiales SGR	\$ 212.229.219		
. Transporte	\$ 26.915.678,00	\$0	0%
Materiales			
Materiales. Mantenimiento maquinaria y equipo PC			
. Servicio de alojamiento comida y bebidas			
TOTAL	\$1.051.762.084,4	\$268.939,764	

✓ **Mano de obra calificada-SGR**

fecha	TOTAL	CONTRATISTA	CDP	CDP	COMPR	V/ ACTIVIDAD	CARGO
	32.903.809,00	GONZALEZ MONTEALEGR E RODRIGO ALBERTO	2721	2621	2621	19.874.784	Investigador profesional en psicología VIPS 160 A2021
23/04	16.120.657,00 13.249.856	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO1	2821	2721	3121	19.433.121	Investigador profesional en psicología VIPS 204 A2021 Y MEMORANDO No. 0045
23/04	20.265.653,00	BONILLA SANTOS JASMIN	2821	2721	3221	13.613.810	Investigador profesional en psicología con doctorado VIPS 205 A2021
23/04	9.716.561, 4.968.696,	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA.	2821432 1	2721/ 4121	3321 / 4921	9.527.874	Investigador profesional en psicología VIPS 206 A2021 Y
26/06	21.256.092,00	FORERO ALDANA ARNULFO EDUARDO	3221	3121	3621	13.376.839	Investigador profesional en psicología VIPS 285 A2021
26/06	10.268.638,00	CALCETO GARAVITO	3321	3221	372	6.624.928	Investigador profesional en psicología

		LAURA NATALIA					VIPS 286 A2021
04/08	11.666.087,00	PARRA RODRIGUEZ MARIO ALFREDO	4321	4121	4121	5.204.090	Investigador/a profesional en ciencias de la salud con doctorad001 2021
04/08	13.927.875,	RODRIGUEZ VAQUIRO RUDY DANIELA	4321	4121	3921	8.12.6597	Investigador/a profesional en áreas afines con especialización MEMORANDO No. 028
04/08	13.421.071,00	SANCHEZ GUARNIZO RUDY MARCELA	4321	4121	4021	10.356.625	Investigador profesional en psicología especialización
13/09	3.577.460	CALA MARTINEZ DORIAN YISELA	4321	4121	4821	264.996	
01/09	13.249.856,00	OLCUNCHE NOSCUE LAURA DANIELA	4321	4121	4621	3.312.464	Investigador, profesional en psicología VIPS 286 A 2021
1/09/2021	4.968.696	AURA MARCELA CUENCA	4721	4321	4121	4.968.696	MEMORANDO No. 0043
9/12/2021		ADRIANA SANDOVAL OLIVER				1.214.570	
TOTAL						115.899.399	

✓ **Mano de obra calificada (UA) – especie**

Este rubro está pendiente se realice certificación por parte de la Universidad la amazonia, está en proceso, está programado para la descarga en diciembre.

✓ **Materiales SGR**

Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Solicitud CDP	CDP	Compr omisos	Cuentas por Pagar	Obliga ciones	Órdenes de Pago	Numero Documento Soporte
154.254.940	77.127.471	DE LA ROSA RESEARC H S.A.S.	4721	4521	5121	11821	11521	95562521	CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021
550.060	550.060	VARGAS RUIZ NATALIA	4621	4421	5221				ORDEN DE SERVICIO 010 2021

154.254.940.	77.677.531	TOTAL
--------------	------------	-------

Se realizó la compra de insumos No comestibles, el valor del contrato es de \$154.254.471 como único oferente exclusivo la Rosa RESERACH S.A.S por \$154.254.940 con contrato 063 del 2021, se realizó el contrato de pago por anticipado por \$77.127.471 y está pendiente por pago por el otro 50%, la mercancía esta para entrega el 23 de diciembre, y está pendiente la entrega y radicar la cuanta de pago.

Se realizó el servicio de fotocopias por un valor de \$ 550.060 a nombre Ciudadanía 1075246858 a nombre de VARGAS RUIZ NATALIA CDP 4621 4421 5221 DEL 2021-10-1, ORDEN DE SERVICIO 010 2021, pendiente de pago.

1.1.1 Administración del proyecto

CONTRATISTAS 2022 -PRIMER SEMESTRE							
VIPS SPGR -030 A2022	7701283	Profesional Administración Y Contaduría	JUAN CARLOS MADRID	\$ 2.484.348	\$ 15.734.204	21/01/2022	30/07/2022
VIPS SPGR -031 A2022	1075241543	Profesional en Derecho.	TATIANA CUBILLOS YUCUMA	\$ 1.656.232	\$ 10.489.469	21/01/2022	30/07/2022

Se contrata el jurídico y el Administrativo para el 2022 primer semestre

1.1. Apoyo a la supervisión

Contrato	CEDULA	PERFIL	NOMBRE CONTRATISTAS	INGRESO /MENSUAL	TOTAL	INICIO	FIN
VIPS SPGR 004 A2022	1080290202	Profesional a la supervisión administrativa, financiera	JENNIFER MONTERO VARGAS	\$ 2.484.348	\$ 21.034.146	17/01/2022	30/09/2022

Se contrata el apoyo a la supervisión 2022 primer semestre

Las siguientes actividades se reprogramaron para el 2022 Y se solicitaron los CDP

- ✓ El rubro de Transporte (VIAJES) se reprogramó para el 2022
- ✓ Los Materiales UA, reprogramado el 2022
- ✓ Materiales. Mantenimiento maquinaria y equipo PC
- ✓ Servicio de alojamiento comida y bebidas

Relación del Talento Humano contratado y contratos realizados 2021 y 2022

2.1.3 *Evaluar y analizar los componentes neuropsicológicos, neurofisiológicos y oculomotores de los sujetos del estudio. (Contratación 2022 de la Actividad)*

CONTRATOS Y CONTRATISTAS SUSCRITOS

CONTRATISTAS 2022 -PRIMER SEMESTRE							
Contrato	CEDULA	PERFIL	NOMBRE CONTRATISTAS	INGRESO /MENSUAL	TOTAL	INICIO	FIN
VIPSS PGR-039 A2022	1082779969	Profesional en psicología	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ	\$ 3.312.464	\$ 15.568.581	27/01/2022	17/06/2022
VIPS SGPR 052 A2022	36309771	Psicólogo/a con doctorado en neurociencias cognitivas o neuropsicología.	BONILLA SANTOS JASMIN	\$ 2.217.281	\$ 10.421.221	28/01/2022	18/06/2022
VIPS SGPR 043 A2022	1075299807	Profesional en psicología	PADILLA GARCÍA LEIDY	\$ 1.656.232	\$ 7.784.290	27/01/2022	17/06/2022
VIPS SPGR-041 A2022	1075312101	Profesional en psicología	FORERO ALDANA ARNULFO	\$ 3.428.402	\$ 15.568.581	27/01/2022	17/06/2022
VIPS SPGR-044 A2022	1075291320	Profesional en psicología	CALCETO GARAVITO LAURA Natalia	\$ 1.656.232	\$ 7.784.290	27/01/2022	17/06/2022
VIPS SPGR-045 A 2022	1082804875	Profesional en psicología o áreas afines con formación complementaria en evaluación neuropsicológica	RUDY MARCELA SANCHEZ GUARNIZO	\$ 2.380.834	\$ 11.031.198	27/01/2022	15/06/2022
VIPS SPGR-053 A2022	1083010201	Profesional en psicología o áreas afines con formación complementaria en evaluación neuropsicológica y/o psicofisiológica	MARIA MONICA CUELLAR CAMERO	\$ 3.571.250	\$ 14.761.167	28/01/2022	01/06/2022
VIPS SPGR-042 A2022	1082422281	Profesional en psicología	LAURA DANIELA OLCUNCHE	\$ 3.312.464	\$ 15.568.581	28/01/2022	18/06/2022
VIPS SPGR-040 A 2022			GOMEZ MORALES DUVAN	\$ 3.312.464	\$ 15.568.581	27/01/2022	17/06/2022
VIPS SPGR-046-A2022	1075221059	Profesional en ciencias sociales y humanas o ciencias de la salud, con	DORIAN GISELA CALA	\$ 993.739	\$ 3.511.211	27/01/2022	12/05/2022

VIPS SPGR 004 A2022	1080290202	Profesional a la supervisión administrativa, financiera y contable.	JENNIFER MONTERO VARGAS	\$ 2.484.348	\$ 21.034.146	17/01/2022	30/09/2022
VIPS SPGR -030 A2022	7701283	Profesional Administración Contaduría	JUAN CARLOS MADRID	\$ 2.484.348	\$ 15.734.204	21/01/2022	30/07/2022
VIPS SPGR -031 A2022	1075241543	Profesional en Derecho.	TATIANA CUBILLOS YUCUMA	\$ 1.656.232	\$ 10.489.469	21/01/2022	30/07/2022

CONTRATISTAS 2021

CONTRATISTAS 2021							
	CEDULA	PERFIL	CONTRATISTA	INGRESO MENSUAL	TOTAL	INICIO	FINAL
1	1110540432	Profesional a la supervisión administrativa, financiera y contable .	RUIZ LEON JHONATAN	\$ 2.484.348	\$ 22.856.002	25/03/2021	30/12/2021
2	1078246875	Profesional en psicología o áreas afines con formación complementaria en evaluación neuropsicológica y/o psicofisiológica	RUDY MARCELA SANCHEZ GUARNIZO	\$ 3.571.250	\$ 17.499.125	04/08/2021	30/12/2021
3	1082804875	Profesional en psicología o áreas afines con formación complementaria en evaluación neuropsicológica y/o psicofisiológica	RUDY DANIELA RODRIGUEZ VAQUIRO	\$ 2.380.834	\$ 11.666.087	04/08/2021	30/12/2021
4	1082779969	Profesional en psicología	RODRIGO ALBERTO GONZALEZ MONTEALEGRE	\$ 3.312.464	\$ 32.903.809	03/03/2021	26/12/2021
5	1075288507	Profesional en Derecho .	POLANIA ROJAS LAURA MELISSA	\$ 1.656.232	\$ 15.237.334	25/03/2021	26/12/2021
6	1075299807	Profesional en psicología	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	\$ 1.844.916	\$ 9.716.561	23/04/2021	30/09/2021
7	1075312101	Profesional en psicología	PADILLA GARCÍA LEIDY TATIANA	\$ 1.656.232	\$ 4.968.696	01/10/2021	30/12/2021
8	1612767		MARIO ALFREDO PARRA RODRIGUEZ	\$ 2.738.994	\$ 13.421.071	04/08/2021	30/12/2021
9	7701283	Profesional Administración y/o contaduría	MADRID CALDERON JUAN CARLOS	\$ 2.484.348	\$ 22.856.002	25/03/2021	26/12/2021
10	1075291320	Profesional en psicología	LAURA NATHALIA CALCETO GRAVITO	\$ 1.656.232	\$ 10.268.638	25/06/2021	30/12/2021
11	1082422281	Profesional en psicología	LAURA DANIELA OLCUNCHE NOSCUE	\$ 3.312.464	\$ 13.249.856	01/09/2021	30/12/2021
12	1075294987	Profesional en psicología	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	\$ 3.778.279	\$ 13.249.856	23/04/2021	30/08/2021
13	1075294987	Profesional en psicología	GOMEZ MORALES DUVAN FERNANDO	\$ 3.312.464	\$ 16.120.657	01/09/2021	30/12/2021
14	1075221059	Profesional en ciencias sociales y humanas o ciencias de la salud, con maestría.	DORIAN GISELA CALA	\$ 993.739	\$ 3.577.460	13/09/2021	30/12/2021
15	36309771	Psicólogo/a con doctorado en neurociencias cognitivas o neuropsicología. Investigador asociado	BONILLA SANTOS JASMIN	\$ 2.451.490	\$ 20.265.653	23/04/2021	27/12/2021
16	1075312101	Profesional en psicología	ARNULFO EDUARDO ALDANA	\$ 3.428.402	\$ 21.256.092	25/06/2021	30/12/2021
17	1075305855	Profesional en psicología	CUENCA PAREDES AURORA MARCELA	\$ 1.656.232	\$ 4.968.696	01/09/2021	30/11/2021
18	1075257280	Profesional en psicología	ADRINA SANDOVAL OLIVERA	\$ 1.214.570	\$ 1.214.570	09/12/2021	30/12/2021
					\$ 255.296.165		
19	9 0 0 3 5 8 5 0 6	Objeto: Compra de insumos consumibles de laboratorio y otros insumos requeridos. OC-063 del 2021	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.	\$154254940		PAGADO EL 10 DE DICIEMBRE EL 50% POR UN VALOR DE \$77127470 SALDOP OR PAGAR DE \$77127470	01/10/2021 30/12/2021
20	1975246858	Objeto: Servicio de fotocopias OC 010 del 2021	NATALIA VARGAS RUIZ (8MULTISEVILLA)	\$550.460			15/10/2021 15/11/2021

RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha Pago	Nit Beneficiario	Beneficiario	No Contrato	Valor
29/12/2021	1075246858	VARGAS RUIZ	ORDEN DE SERVICIO 010 2021	\$550,060.0
28/10/2021	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	CONVENIO 001 2021	\$238,476,000.0
28/10/2021	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	CONVENIO 001 2021	\$101,004,541.0
28/10/2021	891190346	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	CONVENIO 001 2021	\$6,297,480.0
29/12/2021	1075257280	SANDOVAL OLIVERA	VIPS 583 B2021	\$1,214,570.0
29/12/2021	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	MEMORANDO No. 028	\$3,571,250.0
22/12/2021	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	MEMORANDO No. 028	\$3,571,250.0
24/11/2021	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	MEMORANDO No. 028	\$3,571,250.0
14/10/2021	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	MEMORANDO No. 028	\$3,571,250.0
29/09/2021	1082804872	SANCHEZ GUARNIZO MARCELA	MEMORANDO No. 028	\$3,214,125.0
29/12/2021	1110540432	RUIZ LEON	VIPS 184 A2021	\$2,484,348.0
22/12/2021	1110540432	RUIZ LEON	VIPS 184 A2021	\$9,937,392.0
03/09/2021	1110540432	RUIZ LEON	VIPS 184 A2021	\$10,434,261.0
29/12/2021	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO DANIELA	MEMORANDO No. 028	\$2,380,834.0
22/12/2021	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO DANIELA	MEMORANDO No. 028	\$2,380,834.0
24/11/2021	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO DANIELA	MEMORANDO No. 028	\$2,380,834.0
14/10/2021	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO DANIELA	MEMORANDO No. 028	\$2,380,834.0
05/10/2021	1078246875	RODRIGUEZ VAQUIRO DANIELA	MEMORANDO No. 028	\$2,142,751.0
29/12/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$1,656,232.0
22/12/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$1,656,232.0
24/11/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$1,656,232.0
14/10/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$1,656,232.0
29/09/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$1,656,232.0
27/08/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$3,312,464.0

11/06/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$331,246.0
11/06/2021	1075288507	POLANIA ROJAS MELISSA	VIPS 179 A2021	\$3,312,464.0
30/12/2021	I612767	PARRA RODRIGUEZ ALFREDO	001 2021	\$5,386,689.0
22/12/2021	I612767	PARRA RODRIGUEZ ALFREDO	001 2021	\$8,034,382.0
29/12/2021	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	53	\$1,656,232.0
22/12/2021	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	53	\$1,656,232.0
24/11/2021	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	53	\$1,656,232.0
14/10/2021	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	VIPS 206 A2021	\$1,844,916.0
29/09/2021	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	VIPS 206 A2021	\$1,844,916.0
27/08/2021	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	VIPS 206 A2021	\$3,689,832.0
25/06/2021	1075299807	PADILLA GARCÍA TATIANA	VIPS 206 A2021	\$2,336,893.0
29/12/2021	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	VIPS 286 A 2021	\$3,312,464.0
22/12/2021	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	VIPS 286 A 2021	\$3,312,464.0
24/11/2021	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	VIPS 286 A 2021	\$3,312,464.0
14/10/2021	1081422281	OLCUNCHE NOSCUE DANIELA	VIPS 286 A 2021	\$3,312,464.0
29/12/2021	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS 180 A2021	\$2,484,348.0
22/12/2021	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS 180 A2021	\$2,484,348.0
24/11/2021	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS 180 A2021	\$2,484,348.0
14/10/2021	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS 180 A2021	\$2,484,348.0
29/09/2021	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS 180 A2021	\$2,484,348.0
27/08/2021	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS 180 A2021	\$4,968,696.0
25/06/2021	7701283	MADRID CALDERON CARLOS	VIPS 180 A2021	\$5,465,565.0
29/12/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$3,312,464.0
22/12/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$3,312,464.0
24/11/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$3,312,464.0
14/10/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$3,312,464.0
29/09/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$3,312,464.0

27/08/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$6,624,928.0
11/06/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$3,091,633.0
11/06/2021	1082779969	GONZALEZ MONTEALEGRE ALBERTO	VIPS 160 A2021	\$6,624,928.0
30/12/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 009	\$113,239.0
30/12/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 009	\$846,761.0
30/12/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0008	\$1,200,000.0
30/12/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	FORMATO SOLICITUD AVANCE NO. 0007	\$960,000.0
30/12/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	FORMATO SOLICITUD AVANCE No. 0010	\$1,340,000.0
29/12/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	MEMORANDO No. 0061	\$1,920,000.0
29/10/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	MEMORANDO No. 0006	\$960,000.0
29/10/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	SOLICITUD No. 0005	\$960,000.0
27/08/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	MEMORANDO No. 0043	\$2,352,000.0
27/08/2021	7717978	GONZALEZ HERNANDEZ	VIPS 286 A 2021	\$2,352,000.0
29/12/2021	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	MEMORANDO No. 0045	\$3,312,464.0
22/12/2021	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	MEMORANDO No. 0045	\$3,312,464.0
24/11/2021	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	MEMORANDO No. 0045	\$3,312,464.0
14/10/2021	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	MEMORANDO No. 0045	\$3,312,464.0
29/09/2021	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	VIPS 204 A2021	\$3,778,279.0
27/08/2021	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	VIPS 204 A2021	\$7,556,558.0
25/06/2021	1075294987	GOMEZ MORALES FERNANDO	VIPS 204 A2021	\$4,785,820.0
29/12/2021	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS 285 A2021	\$3,428,402.0
22/12/2021	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS 285 A2021	\$3,428,402.0
24/11/2021	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS 285 A2021	\$3,428,402.0
14/10/2021	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS 285 A2021	\$3,428,402.0
29/09/2021	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS 285 A2021	\$3,428,402.0

27/08/2021	1075312101	FORERO ALDANA EDUARDO	VIPS 285 A2021	\$4,114,082.0
04/02/2022	900358506	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.	CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	\$77,127,470.0
14/12/2021	900358506	DE LA ROSA RESEARCH S.A.S.	CONTRATO DE COMPRAVENTA OC 063 2021	\$77,127,469.0
30/12/2021	1075305855	CUENCA PAREDES MARCELA	MEMORANDO No. 0043	\$1,656,232.0
24/11/2021	1075305855	CUENCA PAREDES MARCELA	MEMORANDO No. 0043	\$1,656,232.0
14/10/2021	1075305855	CUENCA PAREDES MARCELA	MEMORANDO No. 0043	\$1,656,232.0
29/12/2021	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS 286 A2021	\$1,656,232.0
22/12/2021	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS 286 A2021	\$1,656,232.0
24/11/2021	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS 286 A2021	\$1,656,232.0
14/10/2021	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS 286 A2021	\$1,656,232.0
29/09/2021	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS 286 A2021	\$1,656,232.0
27/08/2021	1075291320	CALCETO GARAVITO NATALIA	VIPS 286 A2021	\$1,987,478.0
29/12/2021	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	53	\$993,739.0
22/12/2021	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	53	\$993,739.0
24/11/2021	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	53	\$596,243.0
24/11/2021	1075221059	CALA MARTINEZ YISELA	53	\$993,739.0
29/12/2021	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS 205 A2021	\$2,451,489.0
22/12/2021	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS 205 A2021	\$2,451,490.0
24/11/2021	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS 205 A2021	\$2,451,490.0
14/10/2021	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS 205 A2021	\$2,451,490.0
29/09/2021	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS 205 A2021	\$2,451,490.0
27/08/2021	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS 205 A2021	\$4,902,980.0
25/06/2021	36309771	BONILLA SANTOS	VIPS 205 A2021	\$3,105,221.0

CDP EXPEDIDOS Y SALDOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Numero Documento	Recurso	Saldo por Comprometer	Solicitud CDP
2621	ACTI - HUILA	-	2721
2721	ACTI - HUILA	1.188.081,00	2821
3021	ACTI - AMAZONAS	-	3121
3021	ACTI - PUTUMAYO	-	3121
3021	ACTI - TOLIMA	-	3121
3121	ACTI - HUILA	-	3221
3221	ACTI - HUILA	11.216.015,00	3321
4121	ACTI - HUILA	8.062.811,00	4321
4221	ACTI - HUILA	-	4421
4221	ACTI - PUTUMAYO	19.748.000,00	4421
4321	ACTI - HUILA	21.564.343,00	4521
4421	ACTI - HUILA	5.219.609,00	4621
4521	ACTI - CAQUETÁ	-	4721
TOTAL, CDP		66.998.859,00	

SALDOS POR FUENTES A ENERO 2022

FUENTES	FUENTES A 31 - 12- 2021	COMPROMETIDO	SALDO FUENTES A 30-01- 2022
TI18000 - ACTI - CAQUETÁ	\$ 229.012.084,54	\$ 83.480.065,00	\$ 145.532.019,54
TI41000 - ACTI - HUILA	\$ 282.836.948,65	\$ 233.778.125,00	\$ 49.058.823,65
TI73000 - ACTI - TOLIMA	\$ 213.344.622,41	\$ 0,00	\$ 213.344.622,41
TI86000 - ACTI - PUTUMAYO	\$ 297.447.857,26	\$ 289.138.309,00	\$ 8.309.548,26
TI91000 - ACTI - AMAZONAS	\$ 45.359.766,96	\$ 0,00	\$ 45.359.766,96
Total	\$ 1.068.001.279,82	\$ 606.396.499,00	\$ 461.604.780,82

SALDOS Y ACUMULADOS A CORTE 31-12-2021

RESENTA EL INFORME: UNIVERSIDAD

RUBROS	ACUMULADO														SALDO					
	TOTAL	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL							
			ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO			ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO								
1. TALENTO HUMANO	\$ 30.029.135	\$ 194.346.822	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 197.659.286,00	\$ 544.142.183	\$ 69.115.616	\$ -	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 716.258.864							
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662							
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000							
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 77.127.469	\$ 77.127.469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.127.469,00	\$ 138.946.597	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 139.781.999							
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034							
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 6.380.000	\$ 10.652.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.652.000,00	\$ 119.838.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.838.373							
8. INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482							
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 4.140.580	\$ 38.093.336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.093.336,00	\$ 110.967.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.967.544							
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 2.484.348	\$ 22.856.002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.856.002,00	\$ 66.580.526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.580.526							
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
TOTAL	\$ 120.161.532,00	\$ 343.075.629	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 346.388.093,00	\$ 1.558.455.686,82	\$ 272.099.199,00	\$ 14.566.568,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 1.959.686.484,82							

INFORME FINANCIERO A CORTE 31 -12-2021

CÓDIGO DEL PROYECTO:	ACUMULADO						SALDO					
código BPIN 2020000100011	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL		
RUBROS	SGR	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	SGR	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO		
1. TALENTO HUMANO	\$ 194.346.822,00	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 197.659.286,00	\$ 544.142.183	\$ 69.115.616	\$ -	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 716.258.864
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 77.127.469,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.127.469,00	\$ 138.946.597	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 139.781.999
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 10.652.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.652.000,00	\$ 119.838.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.838.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ -	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 38.093.336,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.093.336,00	\$ 110.967.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.967.544
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 22.856.002,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.856.002,00	\$ 66.580.526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.580.526
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 343.075.629,00	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 346.388.093,00	\$ 1.558.455.686,82	\$ 272.099.199,00	\$ 14.566.568,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 1.959.686.484,82

MONTOS APROBADOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:	PERIODO DEL INFORME DESDE EL 03 MARZO AL 30 de Diciembre DE 2021					
código BPIN 2020000100011	MONTO APROBADO (\$):					
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	738.489.005 €	69.115.616 €	3.312.464 €	99.688.601 €	3.312.464 €	913.918.150 €
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	424.393.079 €	202.983.583 €	- €	- €	- €	627.376.662 €
3. CAPACITACIÓN	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	7.760.000 €	- €	- €	- €	- €	7.760.000 €
5. MATERIALES E INSUMOS	216.074.066 €	- €	- €	835.402 €	- €	216.909.468 €
	88.654.636 €	- €	14.566.568 €	- €	5.499.830 €	108.721.034 €
7. GASTOS DE VIAJE	130.490.373 €	- €	- €	- €	- €	130.490.373 €
8. INFRAESTRUCTURA	57.172.748 €	- €	- €	- €	5.228.734 €	62.401.482 €
9. ADMINISTRATIVOS	149.060.880 €	- €	- €	- €	- €	149.060.880 €
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	89.436.528 €	- €	- €	- €	- €	89.436.528 €
11. OTROS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	\$ 1.901.531.315,82	\$ 272.099.199,0	\$ 17.879.032,0	\$ 100.524.003,0	\$ 14.041.028,0	\$ 2.306.074.577,82

SALDOS Y ACUMULADOS A CORTE 30-01.2022


CÓDIGO DEL PROYECTO:									0
código BPIN 202000100011	ACUMULADOS				SALDOS				
RUBROS	SGR	USCO	U AMAZONIA	TOTAL	SGR	USCO	U AMAZONIA	TOTAL	% C FINANCIERO
1. TALENTO HUMANO	\$ 197.394.150,90	\$ 3.312.464,00	\$ 0	\$ 200.706.614,90	\$ 541.094.854	\$ 69.115.616	\$ 103.001.065	\$ 713.211.535,42	21,96%
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ 0	\$ 627.376.662,30	0,00%
3. CAPACITACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	#DIV/0!
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.760.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.760.000,00	0,00%
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 77.677.529	\$ 0	\$ 0	\$ 77.677.529	\$ 138.396.537	\$ 0	\$ 835.402	\$ 139.231.939,20	35,81%
6. PROTECCION Y	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.654.636	\$ 14.566.568	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034,00	0,00%
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 10.652.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.652.000	\$ 119.838.373	\$ 0	\$ 0	\$ 119.838.373,00	8,16%
8. INFRAESTRUCTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.172.748	\$ 0	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482,00	0,00%
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 39.473.529,33	\$ 0	\$ 0	\$ 39.473.529	\$ 109.587.351	\$ 0	\$ 0	\$ 109.587.350,67	26,48%
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 24.015.361,40	\$ 0	\$ 0	\$ 24.015.361	\$ 65.421.167	\$ 0	\$ 0	\$ 65.421.166,60	26,85%
11. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	#DIV/0!
TOTAL	\$ 349.212.571	\$ 3.312.464,0	\$ 0,0	\$ 352.525.034,63	\$ 1.552.318.745	\$ 286.665.767	\$ 114.565.031	\$ 1.953.549.543	15,29%

INFORME FINANCIERO A CORTE 30 -01-2022

CÓDIGO DEL PROYECTO:												
código BPIN 202000100011	ACUMULADO					SALDO						
RUBROS	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL	SGR	U. SURCOLOMBIANA		U. DE LA AMAZONIA		TOTAL
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO			ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	
1. TALENTO HUMANO	\$ 197.394.150,90	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 200.706.614,90	\$ 541.094.854	\$ 69.115.616	\$ -	\$ 99.688.601	\$ 3.312.464	\$ 713.211.535
2. EQUIPOS Y SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.393.079	\$ 202.983.583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627.376.662
3. CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.760.000
5. MATERIALES E INSUMOS	\$ 77.677.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.677.529,00	\$ 138.396.537	\$ -	\$ -	\$ 835.402	\$ -	\$ 139.231.939
6. PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.654.636	\$ -	\$ 14.566.568	\$ -	\$ 5.499.830	\$ 108.721.034
7. GASTOS DE VIAJE	\$ 10.652.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.652.000,00	\$ 119.838.373	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.838.373
8. INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.172.748	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.734	\$ 62.401.482
9. ADMINISTRATIVOS	\$ 39.473.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.473.529,33	\$ 109.587.351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.587.351
10. APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$ 24.015.364,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.015.364,40	\$ 65.421.164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.421.164
11. OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 349.212.573,6	\$ -	\$ 3.312.464,00	\$ -	\$ -	\$ 352.525.037,63	\$ 1.552.318.742,19	\$ 272.099.199,00	\$ 14.566.568,00	\$ 100.524.003,00	\$ 14.041.028,00	\$ 1.953.549.540,19
												\$ 2.306.074.577,82

Presupuesto y Gastos			
Saldo por ejecutar a 31 de diciembre del 2021	\$ 1.959.686.484,82		
Gastos a enero 2022			
Talento Humano		\$ 3.047.328,90	
Administración		\$ 1.380.193,33	
Pago Multisevillas -fotocopias		\$ 550.060,00	
Apoyo a la Supervisión		\$ 1.159.362,40	
		\$ 6.136.944,63	
Pagos por realizar contratado 2021			\$ 1.953.549.540,19
OC 063 DE LA ROSA RESEARCH		\$ 77.127.470,00	
50% POR PAGAR			
Rubro Girado / por ejecutar Uniamazonia		\$ 345.778.021,00	
Convenio Usco-Uniamazonia			
Saldo por ejecutar a Enero 2022			\$ 1.530.644.049,19

INFORME DE GESPROY

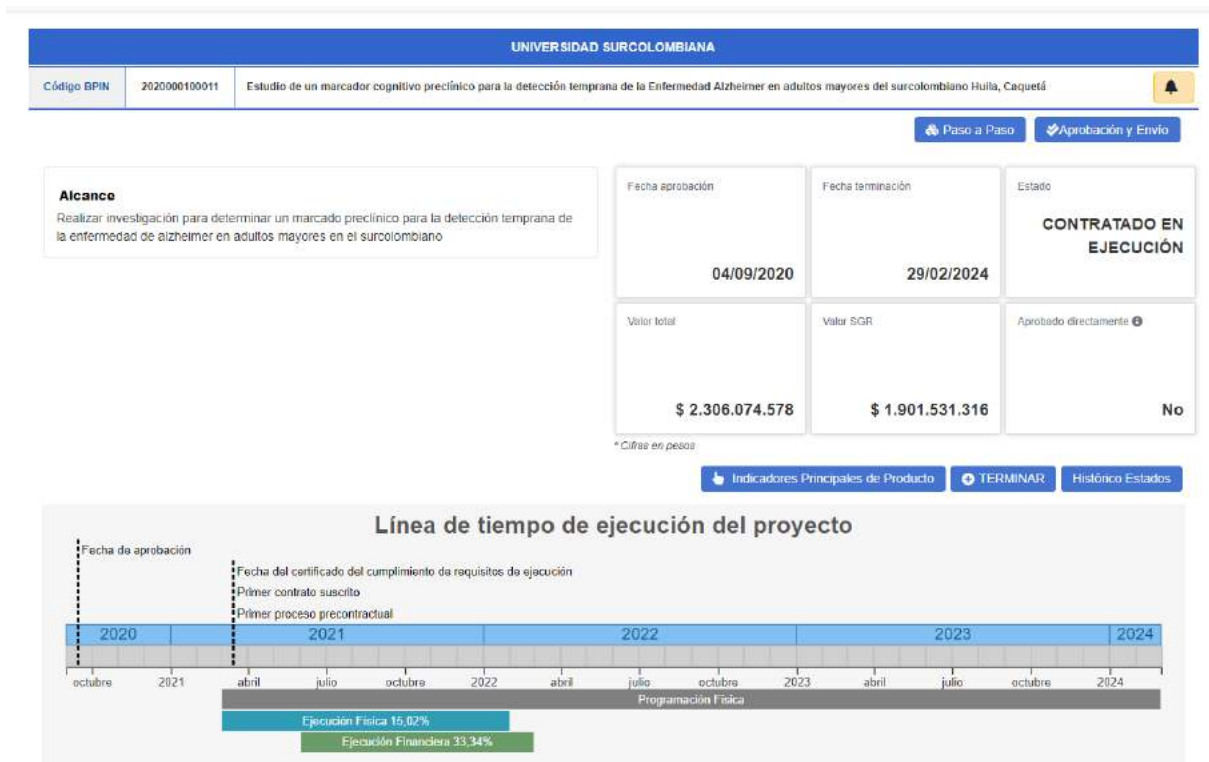

El cargue se ha realizado en las fechas programadas y es consistente con los saldos financieros, sin embargo, es de recordar que no se ha cargado financieramente el recurso girado en el convenio de la USCO y la Uniamazonia ya que no sean realizado pagos.

La ejecución física del proyecto está el 15,02% y la financiera en un 33,34%

Se esta realizando la gestión para eliminar


ALERTAS DE GESPROY

1. El proyecto no cuenta con información completa y/o consistente según el estado, por lo tanto, el indicador de cobertura de información es cero (0), que genera un IGPR =0, en la próxima medición.

EJ-1-01Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad altoAlertas para el proyecto con un nivel de criticidad medio Alertas para el proyecto con un estado en nivel de criticidad moderado	Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY- SGR.	Proyectos: Contrato(s) sin rp: CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA;MEMORANDO N 0105-H
---	---	--

Se realizo en el mes de enero y febrero la actualización y cargue de información que faltaba, adicionalmente se está realizando el proceso ante el DNP la solicitud de eliminación de Gesproy en el Proyectos el alerta contrato(s) **sin RP: convenio especial de cooperación suscrito entre la; memorando N 0105-H**, el cual no tiene RP Y CDP asociado, no tiene información asignada y no se deja eliminar en forma manual.

Anexo pantallazo

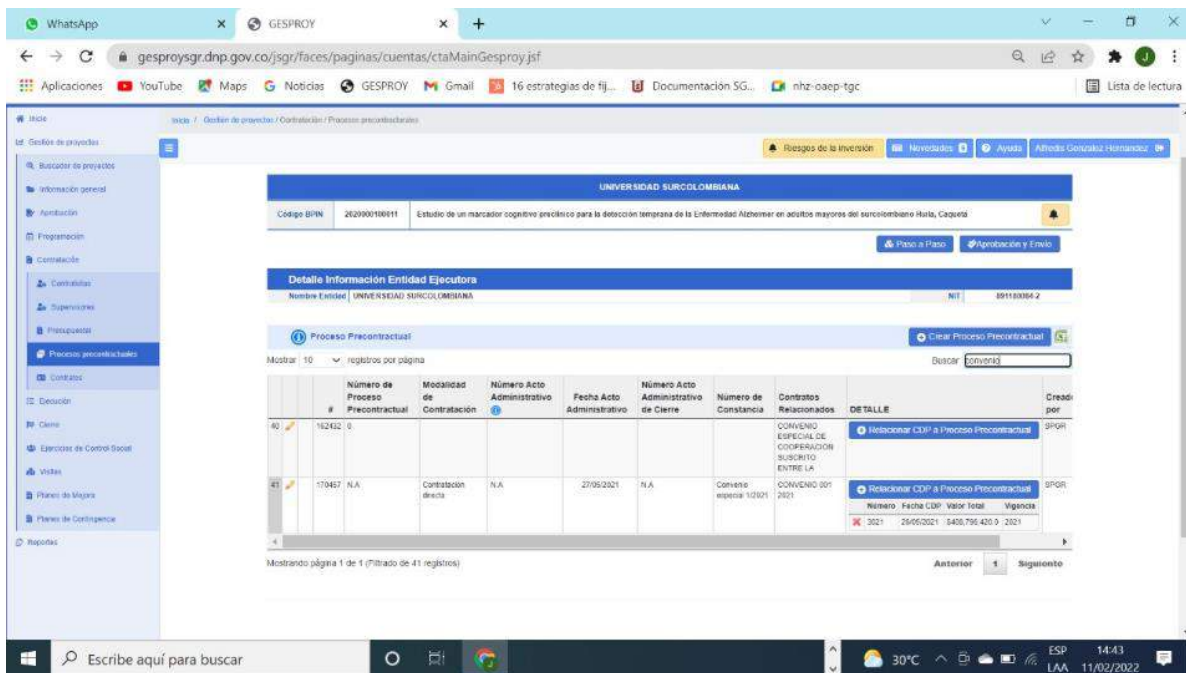


The screenshot shows the GESPROY web application. A table lists contracts with columns for contract number, date, and value. A modal window titled 'Borrar Contratos' is open, displaying details for contract 891190346. The modal includes fields for 'Fecha Suscripción de...', 'Tipo Contrato' (SPGR Por definir), 'Número Del Docume...' (891190346), 'Identificación del Con...' (891190346-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA), and 'Valor Contrato Para P...' (345.778.021,00). An error message states: 'El contrato no pudo ser borrado, existe información relacionada que debe ser borrada previamente'. Buttons for 'Borrar' and 'Cancelar' are visible.

The screenshot shows the 'Detalle Información Contratos' page in the GESPROY system. It displays the following information:

- UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA**
- Código BPIN:** 202000100011
- Estudio de un marcador cognitivo preclínico para la detección temprana de la Enfermedad Alzheimer en adultos mayores del surcolombiano Huila, Caquetá**
- Botones:** Pasa a Pasa, Aprobación y Envío
- Listado de contratos:** Pagos del Contrato, Registro Audiovisual, Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato
- Detalle Información Contratos:**

Contrato No	Tipo de Contrato	Medioides de Contratación
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA	SPGR Por definir	
Identificación del Contratista	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Tipo Contratista
891190346-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	891190346	Entidad Pública
Objeto	Valor Contrato Para Proyecto	
ALIANZA E ESFUERZO EN PRO DE LA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ DE LA ALIANZA "BIENESTAR PARA NUESTROS MAYORES" DANDO LOS LINEAMIENTOS PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ALIADAS Y LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO, LOGRANDO UNA VINCULACION DE LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS PARA LA ACADEMIA Y LA COMUNIDAD DEL SUR COLOMBIANO	345.778.021,00	
Fecha de Inicio	Fecha Final Contractual	Fecha Final Real
Fecha Suscripción del Contrato	Plazo Contractual	Término Para Liquidación en Meses
		Mes(es)
Proceso Precontractual	Manejo Múltiples Proyectos	Contrato Valor Total
0	No	345.778.021,00
Estado Contrato		
Contratado sin Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No
- Contratista:**

Representante Legal	Número ID Representante Legal	Departamento
LEONIDAS RICO MARTINEZ	17624610	CAQUETA
Municipio	Es Fundación	Fecha Constitución Fundación
FLORENCIA	No	
Interventor Técnico		

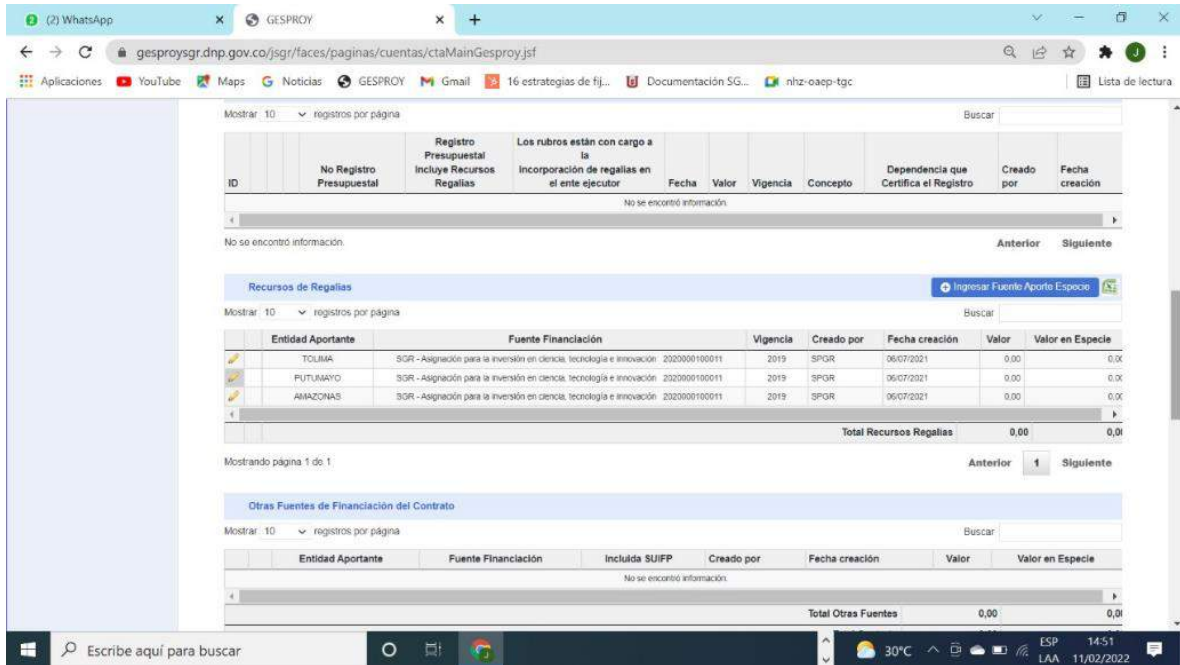

The screenshot shows the GESPROY system interface with the following tables:

Table 1: Main Data Table

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
No se encontró información.										

Table 2: Recursos de Regalías

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
TOLIMA	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	2020000100011	2019	SPQR	06/07/2021	0,00
FUTUAMATO	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	2020000100011	2019	SPQR	06/07/2021	0,00
AMAZONAS	SGR - Asignación para la inversión en ciencia, tecnología e innovación	2020000100011	2019	SPQR	06/07/2021	0,00
Total Recursos Regalías						0,00

Table 3: Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Incluida SUIFP	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
No se encontró información.						
Total Otras Fuentes						0,00

Anexo Informe Financiero de la UNIMAZONIA a corte 30 de enero de 2022.

<https://drive.google.com/drive/folders/1BOOBEwzR6kuazlTWZWQW2YECuZ6SVAHm?usp=sharing>



ALFREDIS GONZALEZ HERNADEZ
Coordinador del Proyecto

Proyecto



JUAN CARLOS MADRID C
ASESOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

LABORATORIO DE NEUROCOGNICIÓN Y PSICOFISIOLOGÍA

NIVEL DE AVANCE: 70%

Contrato de obra No 152 del 27 de octubre del 2021

Contratista: Constructora Arquimes ZOMAC SAS

Objeto: Adecuación de un espacio para el laboratorio de neurocognición y psicofisiología en la Universidad de La Amazonia.

Valor: \$57.024.493.

Supervisor: Mauricio Alejandro Méndez Moreno.

Fecha de Inicio: 11 de noviembre del 2021.

Fecha de Terminación: 11 de febrero del 2022.

Adjunto imagen del acta de inicio y de la construcción.



NIT 891.190.346-1


 Universidad de la Amazonia
 Vigilada Ministerio de Educación Nacional

Fecha: 11 de noviembre de 2021

OBJETIVO
 Descripción del acta de inicio del Contrato de Obra No. 152 de fecha 27 de octubre de 2021.
 Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del contrato, por tanto, el punto de partida para el control del plazo y el cumplimiento por parte del contratador.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
1. CONTRATO No.	152
2. CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ARQUIMES ZOMAC SAS
3. OBJETO	ADecuación de un espacio para el laboratorio de neurocognición y psicofisiología en la Universidad de la Amazonia
4. VALOR	\$57.024.493
5. EL SUPERVISOR (A)	MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO
6. FECHA DE INICIO	11 de noviembre de 2021
7. FECHA DE TERMINACIÓN	11 de febrero de 2022
8. AREA RESPONSABLE	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

El presente, a los días 11 de noviembre de 2021, en las instalaciones de la Universidad de la Amazonia en compañía del señor MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO representante con facultad de suscripción de la Universidad de la Amazonia, con sede de desarrollo en el campus de Quevedo de la Carrera de Obra No. 152 de 2021 y el señor JAVIER SUAREZ ESCOBAR representante de la Constructora Arquimes ZOMAC SAS con NIT. 891.190.346-1, en calidad de contratista, y conmutación que se le requiera para ser parte del desarrollo del contrato suscrito, en adelante y en virtud de lo que se indica:

1. Se declara la vigencia del contrato de obra No. 152 de fecha 27 de octubre de 2021. 2. Se declara la vigencia del contrato de obra No. 152 de fecha 27 de octubre de 2021.

NO. DE POLICIA	CONCEPTO DEL ASIGNADO	%	VERBENA	GASTA
010000-0	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	01	20190001	20190002
010000-0	MANTENIMIENTO	100	20190001	20190002
010000-0	PRESTACIONES DE SERVICIOS	100	20190001	20190002
010000-0	CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	20190001	20190002
010000-0	SEGUIMIENTO DE LA OBRAS	100	19000002	20190001
010000-0	RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRATIVA	100	01000001	20190001

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
 www.uniamazonia.edu.co
 Florencia Caquetá

NIT 891.190.346-1


 Universidad de la Amazonia
 Vigilada Ministerio de Educación Nacional

Fecha: 11 de noviembre de 2021

FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR
13-11-2021	13-11-2021	\$57.024.493,00
27-10-2021	27-10-2021	\$57.024.493,00

ACUERDO
 1. Se declara la vigencia del contrato de obra No. 152 de fecha 27 de octubre de 2021.
 2. Se declara la vigencia del contrato de obra No. 152 de fecha 27 de octubre de 2021.
 3. Se declara la vigencia del contrato de obra No. 152 de fecha 27 de octubre de 2021.

MAURICIO ALEJANDRO MÉNDEZ MORENO
 JAVIER SUAREZ ESCOBAR

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonia
 Calle 17 Diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
 atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
 www.uniamazonia.edu.co
 Florencia Caquetá

la. Amazonia

COMPRAS DE ELEMENTOS

-CONTRATO COMPRAVENTA #214 DE 2021

Adquisición De Licencia E. Prime V.3 Perpetua Académico Nueva y Sistema de Almacenamiento.
Dieciséis Millones Seiscientos Ochenta Y Siete Mil Trecientos Setenta Pesos (16.687.370)
Comercializadora Mundo Hbc Zomac S.A.S
Fecha De Inicio 30 De Diciembre De 2021/ Fecha De Terminación 01 De Marzo De 2022

- CONTRATO DE COMPRAVENTA #217 DE 2021

Adquisición De Gafas Con Rastreo Ocular Y Descansa Barbilla
Veintitrés Millones Ochocientos Cuarenta Y Siete Mil Seiscientos (23.847.600) Mcte
Didácticos Y Libros Didaclibros Ltda.
Fecha De Inicio 30 De Diciembre De 2021/ Fecha De Terminación 01 De Marzo De 2022

- CONTRATO DE COMPRAVENTA xxx DE 2022 -PENDIENTE

Computador Portátil (2) Impresora multifuncional
Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Pesos (\$9.999.000.) Mcte.
Fotocopiadora Del Lector- Edificio Alta Tecnología
Fecha De Inicio 28 De Enero De 2022/ Fecha De Terminación 20 De Marzo De 2022

- CONTRATO DE COMPRAVENTA xxx DE 2022 -PENDIENTE

Adquisición Del Equipo De Sistema Activetwo Biosemi Con Sus Respective Accesorios
Doscientos Ochenta Y Ocho Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Doscientos Sesenta Pesos
(288.163.260.00). IVA Incluido.
De La Rosa Research Sas
Fecha De Inicio 28 De Enero De 2022/ Fecha De Terminación 20 De Marzo De 2022

Cordialmente,



JENIFER RUEDA VARON

Coordinadora Programa de Psicología

Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía

Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir
atencionalciudadano@uniamazonia.edu.co
www.uniamazonia.edu.co
Florencia Caquetá

